



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС

Smeta.RU

16.Сопоставительная ведомость

В этом разделе руководства пользователя описано создание и наполнение смет на изменение (+/-) для учета корректировок в проектной документации, а также формирование сопоставительных ведомостей для фиксации изменений в объемах и стоимости работ.

Сметы на изменение (+) и (-) - это локальные сметы, которые разрабатываются при внесении изменений в проектную или сметную документацию. Смета (+) содержит добавляемые работы, материалы и затраты, а смета (-) - исключаемые или уменьшаемые работы, материалы и затраты.

На основе созданных смет на изменение (+/-) формируются сопоставительные ведомости объемов работ (СВОР) и изменения сметной стоимости.


Сопоставительная ведомость изменений видов, объемов работ и сметной стоимости - документ, прилагаемый к корректируемой сметной документации и содержащий детализированное сравнение видов, объемов работ (затрат) и их сметной стоимости в редакциях "до изменений" и "с учетом изменений", с указанием обоснования (причин) корректировки и ссылок на листы ведомостей объемов работ и проектной (технической) документации.

Данная ведомость разрабатывается для смет в ТСН-2001 МГЭ и регламентирована Главой 12 Общих указаний по применению ТСН-2001.


Создание смет на изменение

Создание смет на изменение доступно для смет в составе проекта или объекта строительства.

Для создания смет на изменение выберите локальную смету, нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Создать смету на изменение"

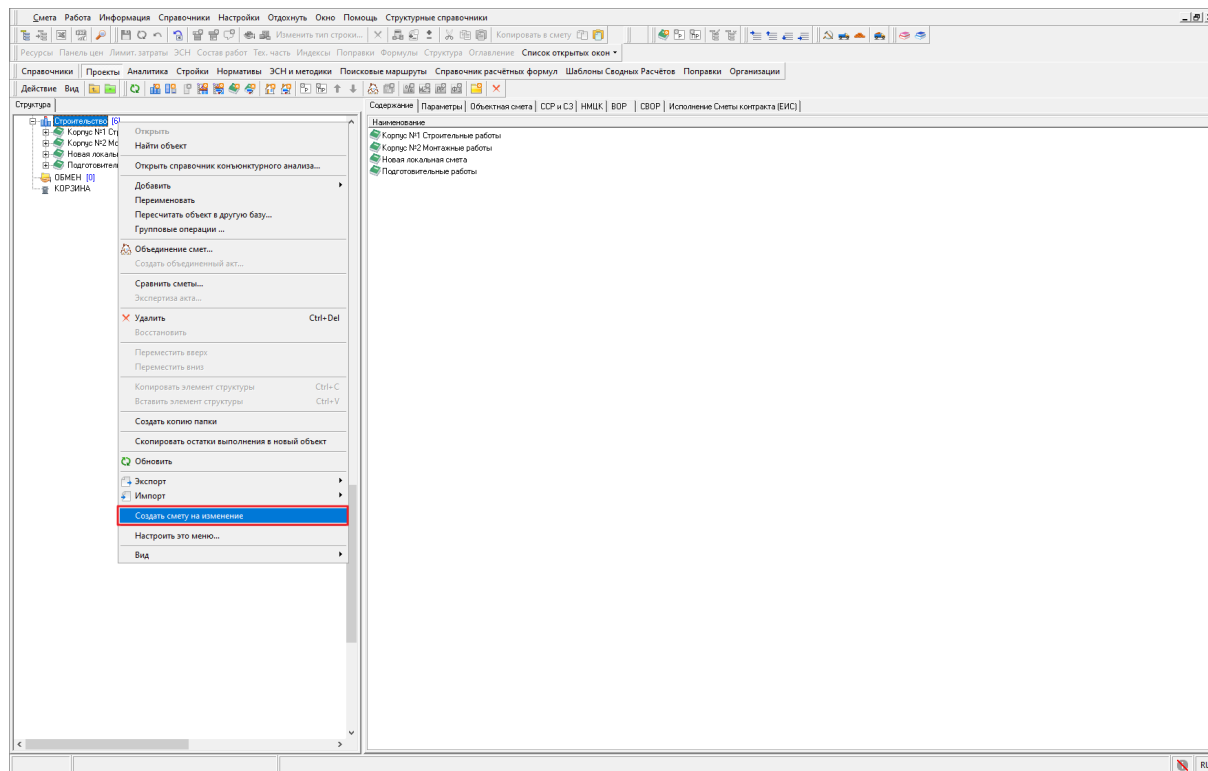

В результате будут добавлены две сметы, к наименованию и шифру которых будет добавлено (1+) и (1-)

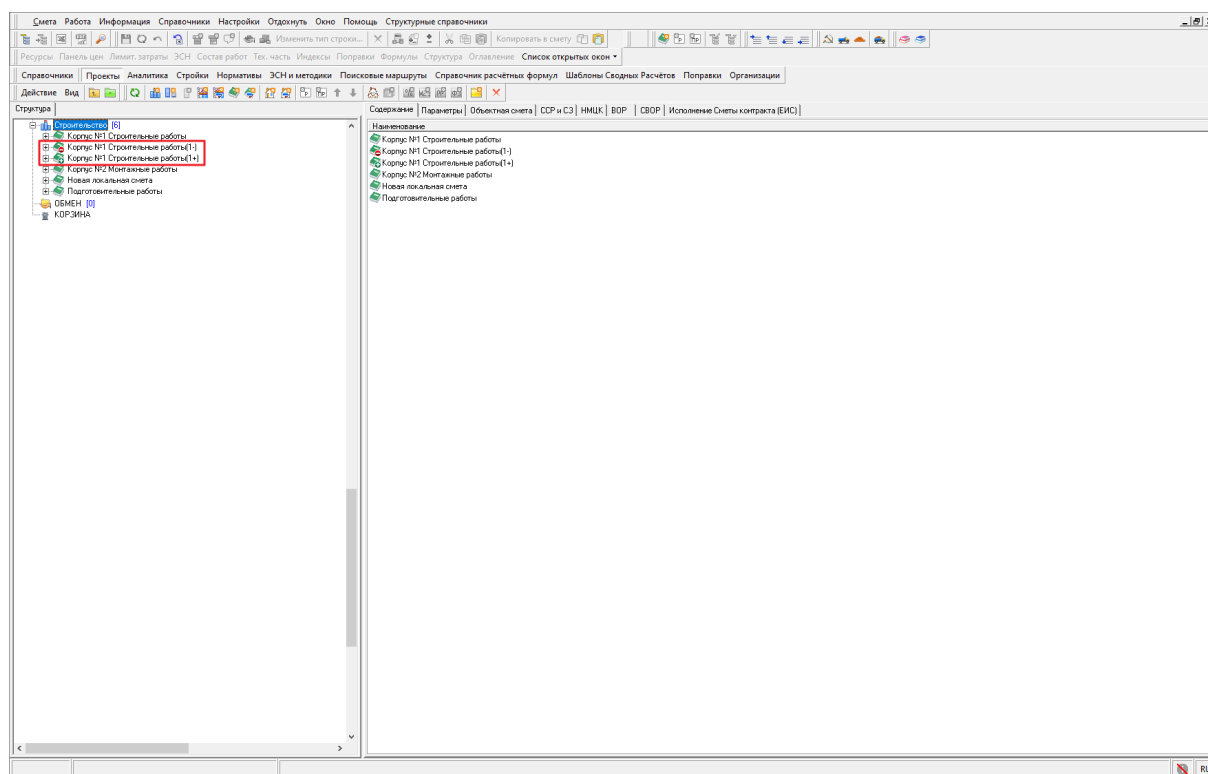

Наименования смет можно изменить вручную.

Количество смет на изменения не ограничено. При создании следующих пар смет номера увеличиваются: (2+) и (2-), затем (3+) и (3-) и так далее.


К сметам на добавление (+) допускается создание дополнительного комплекта смет на изменение, в таком случае сметы будут иметь нумерацию (1+) (1+) и (1+) (1-), соответственно увеличивая вторую цифру при добавлении последующих комплектов.

Исходной считается смета, к которой был создан комплект смет на изменения. Если к смете на добавление создаются новые сметы на изменения, то исходной сметой в этом комплекте смет будет считаться та, к которой и был создан новый комплект.




Сметы на изменения имеют индикацию и .


После создания смет на изменения на вкладке "Содержание" будет добавлена секция "Изменения в смету"

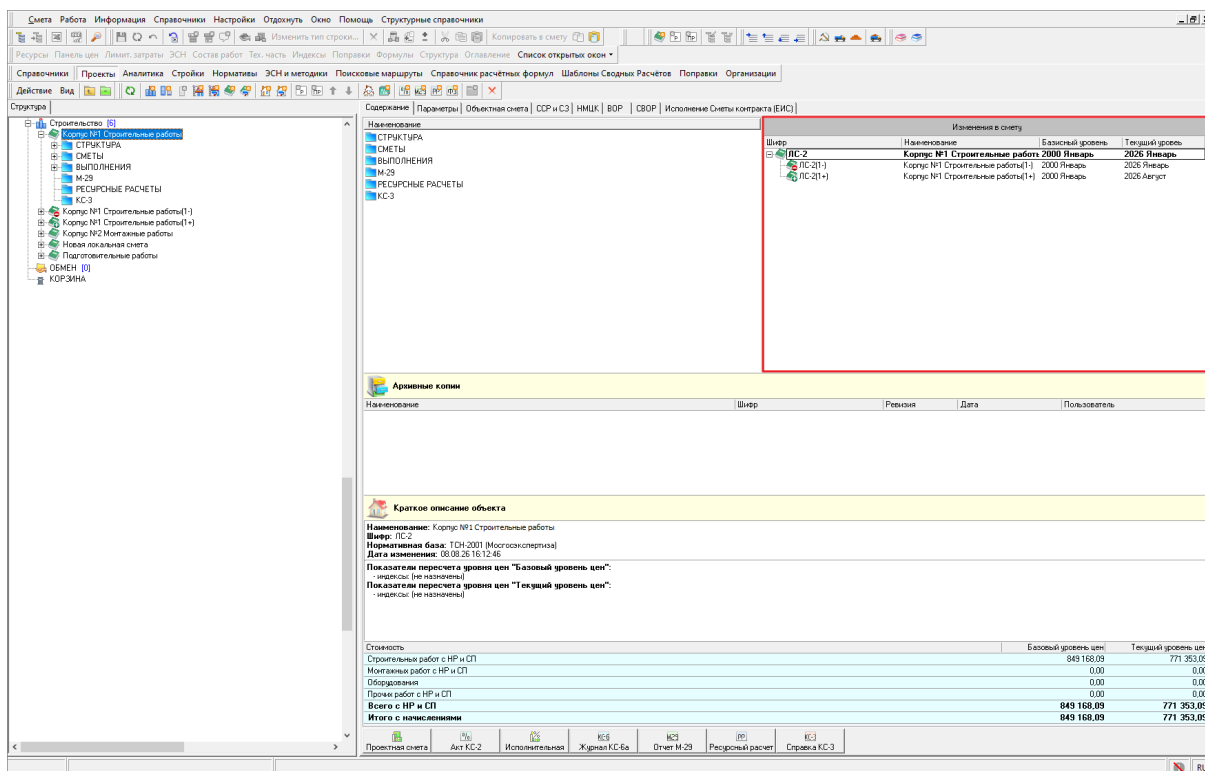

Нажав правой кнопкой мыши на смету в секции "Изменения в смету", можно открыть контекстное меню и перейти к этой смете в менеджере либо открыть ее

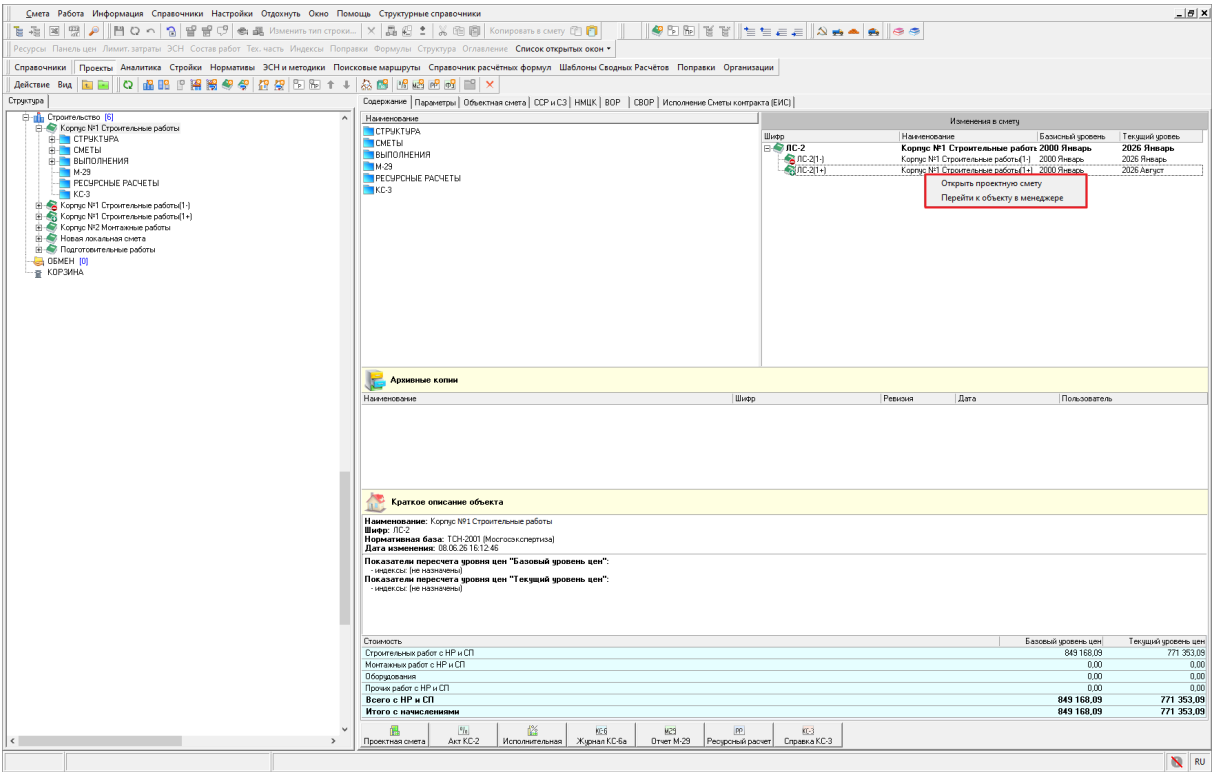

Откройте смету на изменение и внесите строки. Чтобы изменить строки из исходной сметы, перетащите их в смету на изменение. Это автоматически сформирует связи между ними в сопоставительной ведомости объемов работ

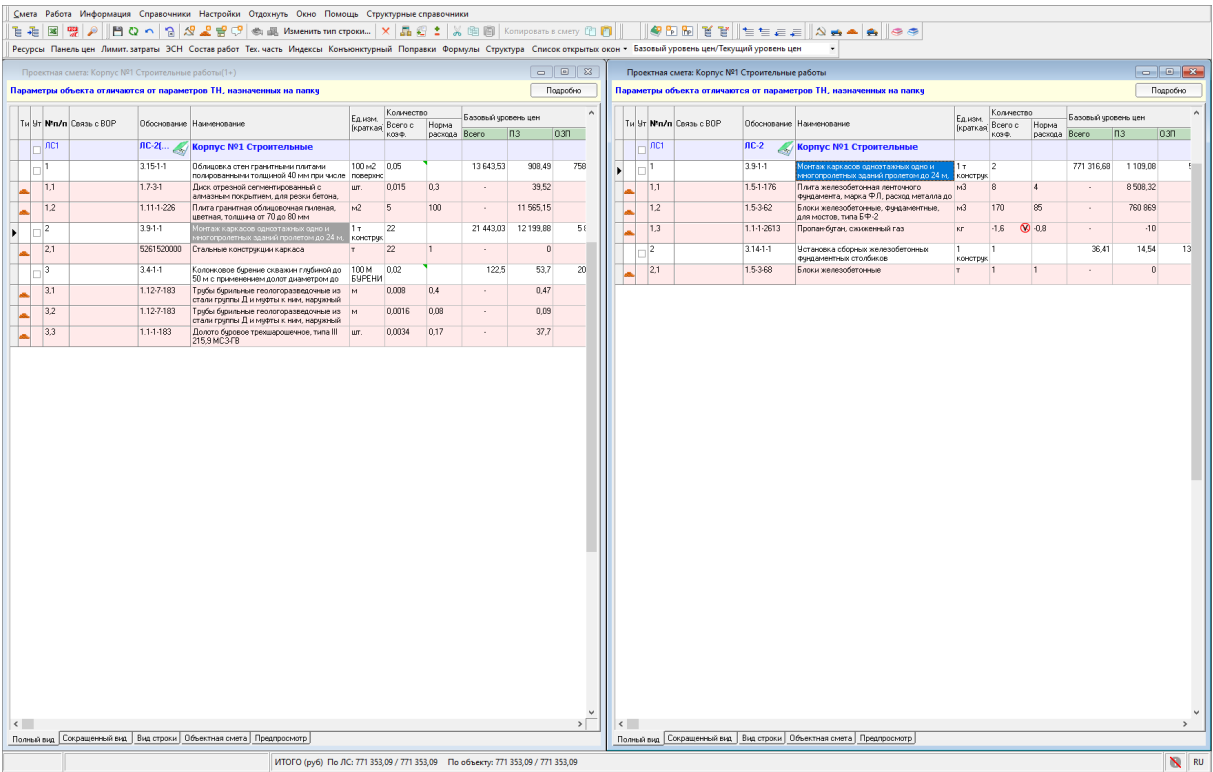

Напоминание: Для одновременного отображения двух смет нажмите в главном меню "Окно" - "Упорядочить вертикально".

Правила формирования связей при перетаскивании строк:

- Связь создается только при перетаскивании из исходной сметы в смету на изменение. Перетаскивание вверх по иерархии или между комплектами на одном уровне не предусмотрено.
- Каждую строку исходной сметы можно связать только с одной строкой в одном комплекте смет на изменение.
- Если связь создать нельзя, строки будут скопированы без связи.

Добавление строк может быть осуществлено и стандартными методами, включая ввод по шифру, поиск, копирование из сборника или импорт сметы.


При формировании смет на изменение важно учитывать, что исключаемые и добавляемые работы, материалы и затраты рассчитываются в разных уровнях цен:

- Смета на (+) рассчитывается в текущем уровне цен, на дату корректировки сметной документации, в нее необходимо внести строки тех работ и материалов, которые добавляются к исходной смете: дополнительные объемы, новые виды работ или материалы, отсутствовавшие в первоначальной смете.
- Смета на (-) рассчитывается в уровне цен исходной сметы, в нее необходимо внести строки тех работ и материалов, которые исключаются или уменьшаются: отменяемые работы, сокращенные объемы или заменяемые на более дешевые/меньшие по объему материалы и работы.

Экспорт смет на изменение во внутреннем формате

Комплект смет на изменение вместе с первоначальной сметой можно экспортировать во внутренний формат ***.sobx**.

Для этого нажмите на первоначальную смету правой кнопкой мыши и выберите "Экспорт" - "Экспорт объектов (*.sobx)"

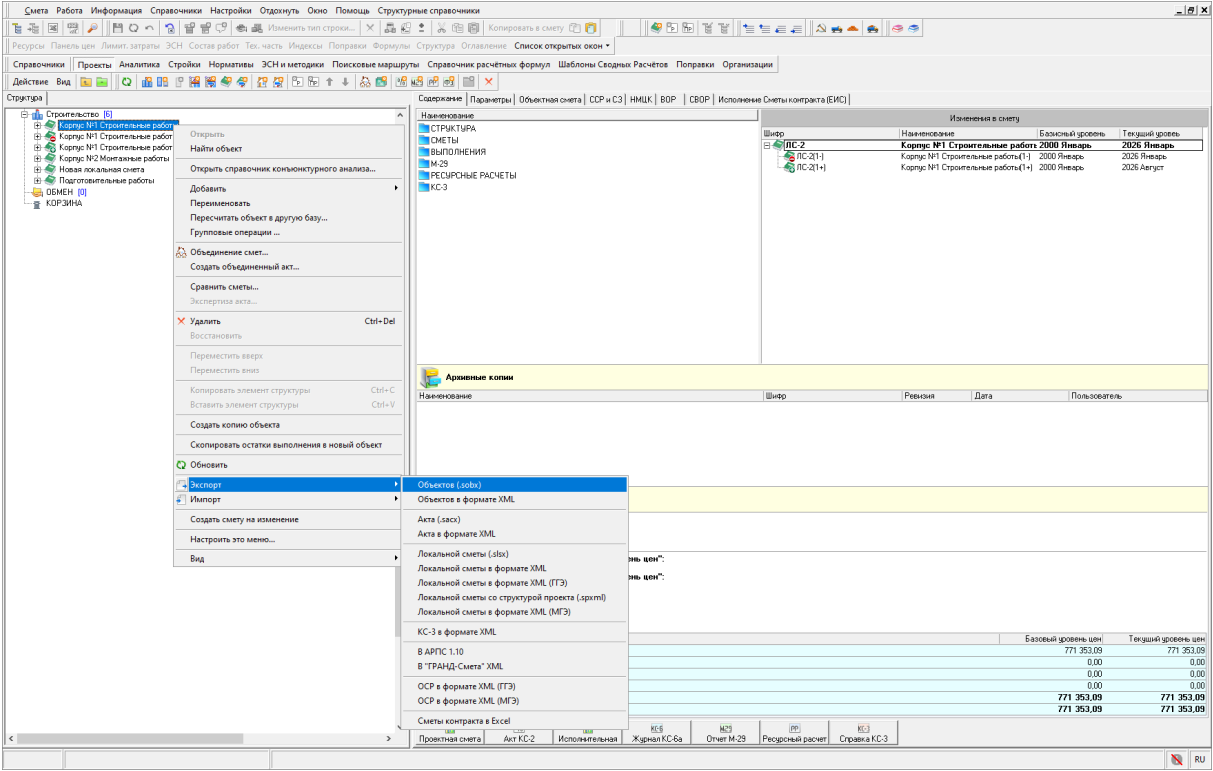

Выберите папку для сохранения файлов и нажмите "Сохранить". Дождитесь окончания экспорта.

При экспорте переносятся все связи между позициями и сметами. Вместе с первоначальной сметой созданные сопоставительные ведомости также будут экспортированы.

Чтобы экспортировать смету на изменение отдельно от первоначальной, необходимо запустить экспорт непосредственно на нужной смете. В этом случае она будет экспортирована как обычная локальная смета, без признака "смета на изменение".


Сопоставительная ведомость

Для формирования и работы с документом сопоставительной ведомости изменения объемов работ и изменения сметной стоимости реализован режим, получивший название "СВОР".


Сопоставительная ведомость формируется на основе исходной сметы и смет на изменение (+) и (-) в составе проекта или объекта строительства.

Создание сопоставительной ведомости

Для создания сопоставительной ведомости откройте вкладку "СВОР" на узле локальная смета

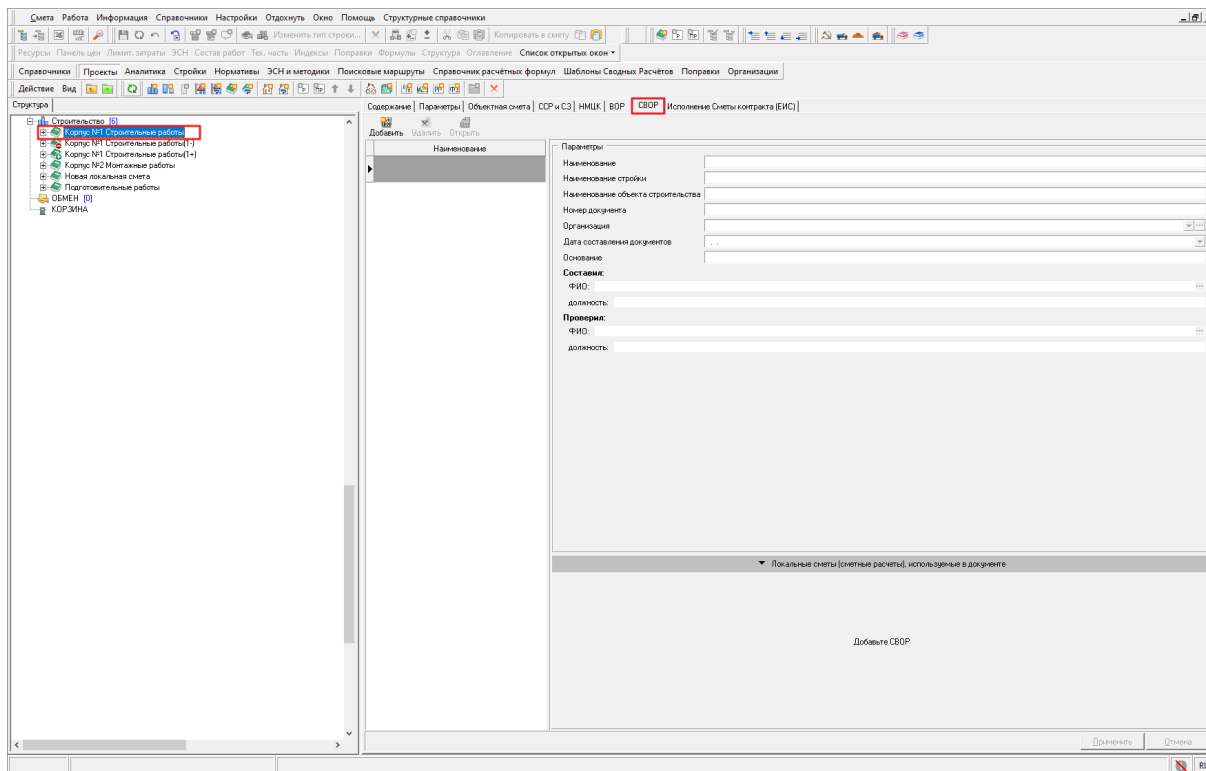

Затем на панели инструментов вкладки СВОР нажмите "Добавить", чтобы создать новый документ

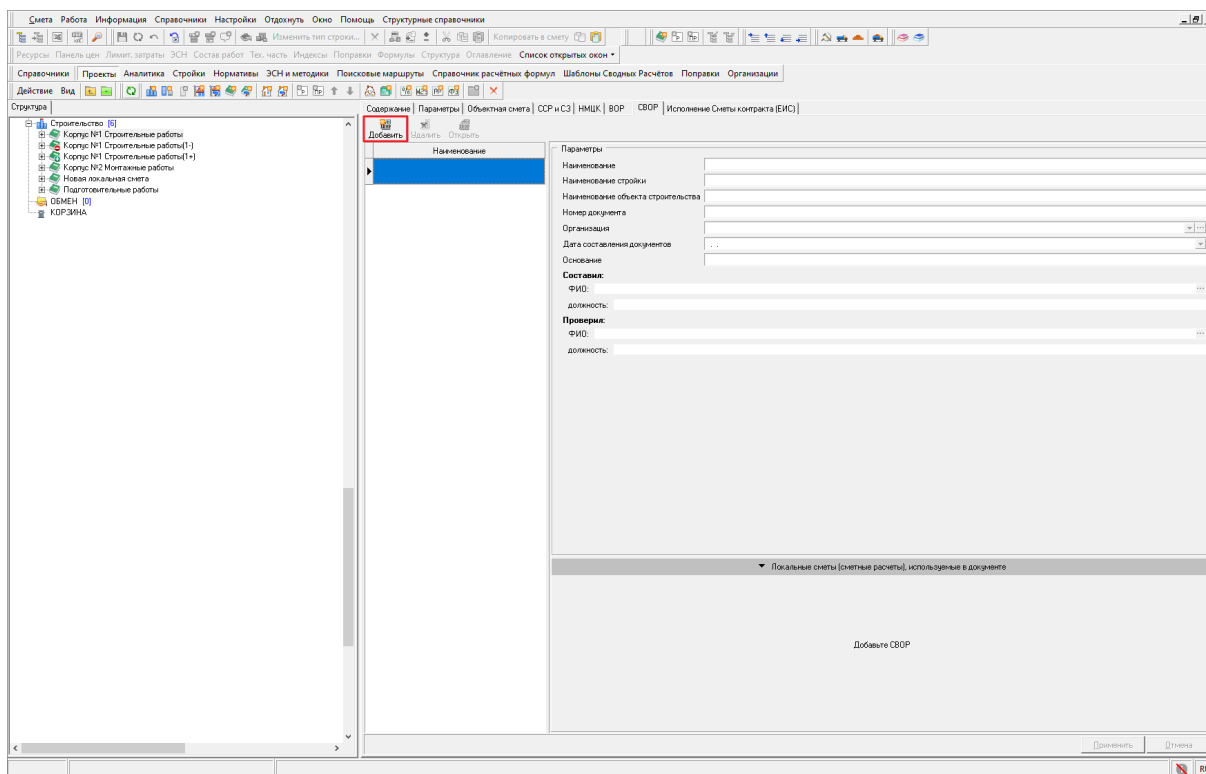

После создания сопоставительной ведомости, она появляется в списке. В правой части окна содержатся параметры и дерево локальных смет, используемых в документе.

Параметры сопоставительной ведомости

Параметры сопоставительной ведомости содержат следующие поля:


- Наименование - заполняется по умолчанию "Наименование СВОР", можно изменить.
- Наименование стройки - заполняется согласно полному наименованию Проекта (при наличии), можно изменить.
- Наименование объекта строительства - заполняется согласно полному наименованию объекта строительства, а при его отсутствии - локальной сметы, можно изменить.
- Организация - заполняется вручную или выбирается из списка организаций.
- Номер документа - заполняется вручную.
- Дата составления документа - заполняется вручную или выбором из календаря.
- Основание - заполняется вручную.
- Составил - заполняется вручную или выбирается из списка организаций.
- Проверил - заполняется вручную или выбирается из списка организаций.

Шифр	Наименование	Базисный уровень	Текущий уровень
КС-2	Корпус №1 Строительные работы	2000 Январь	2005 Январь
КС-2(1)	Корпус №1 Строительные работы(1)	2000 Январь	2005 Январь
КС-2(1+)	Корпус №1 Строительные работы(1+)	2000 Январь	2005 Август

После заполнения параметров для их сохранения нажмите "Применить".

Включение смет в сопоставительную ведомость

В секции "Локальные сметы (сметные расчеты), используемые в документе" отображаются все сметы, участвующие в документе

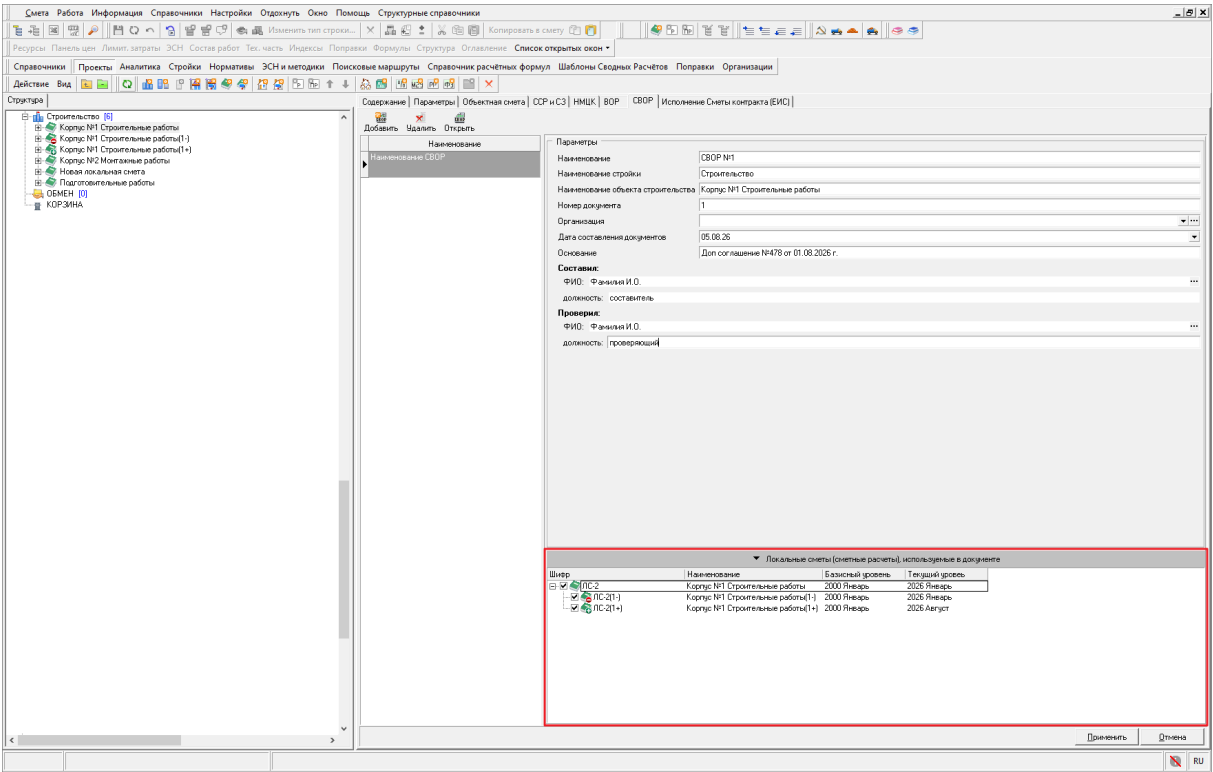


У каждой сметы есть флажок включения. Если флажок установлен смета участвует в расчете, если снят - она исключается из документа.


При создании документа все существующие сметы включаются автоматически. Новые сметы, добавленные позже, появляются в дереве, но по умолчанию не включаются в расчет.

Документ сопоставительной ведомости

Для того чтобы открыть сопоставительную ведомость, выделите ее и на панели инструментов нажмите "Открыть"

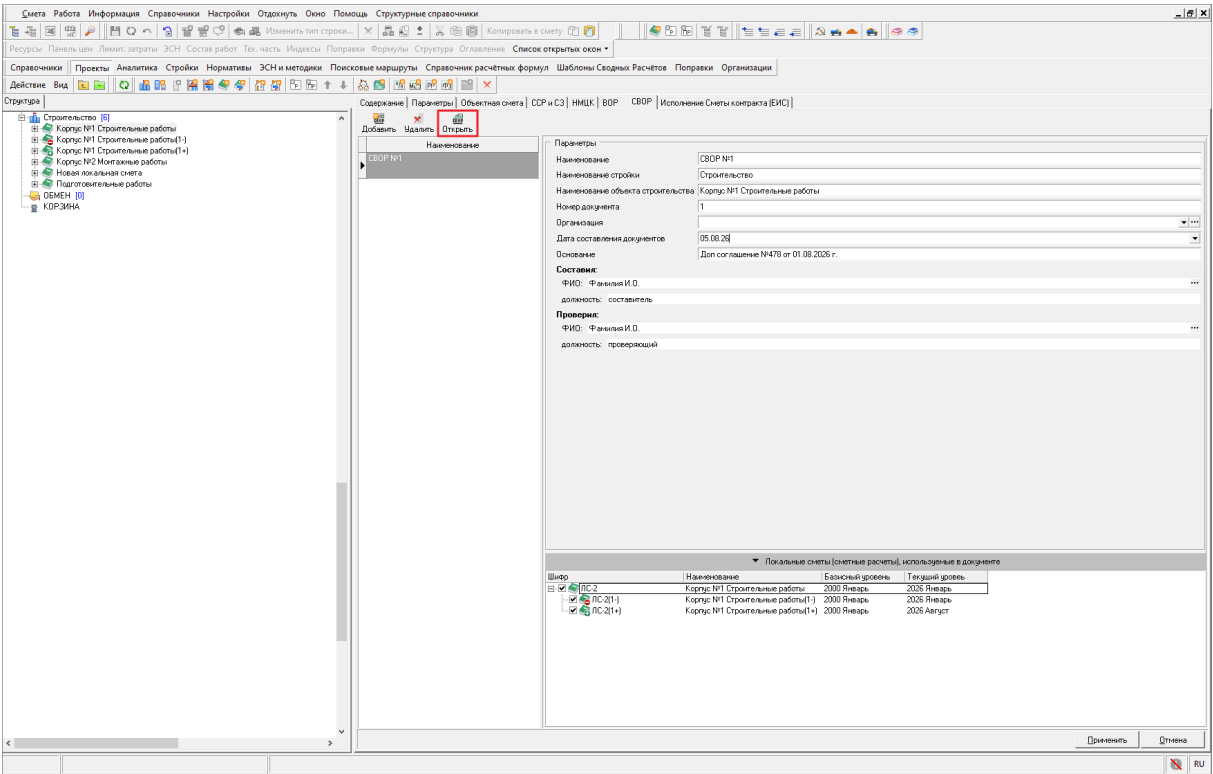

Документ сопоставительной ведомости разделен на две части: слева отображается рабочая область ведомости, справа - смета и ее позиции для сопоставления

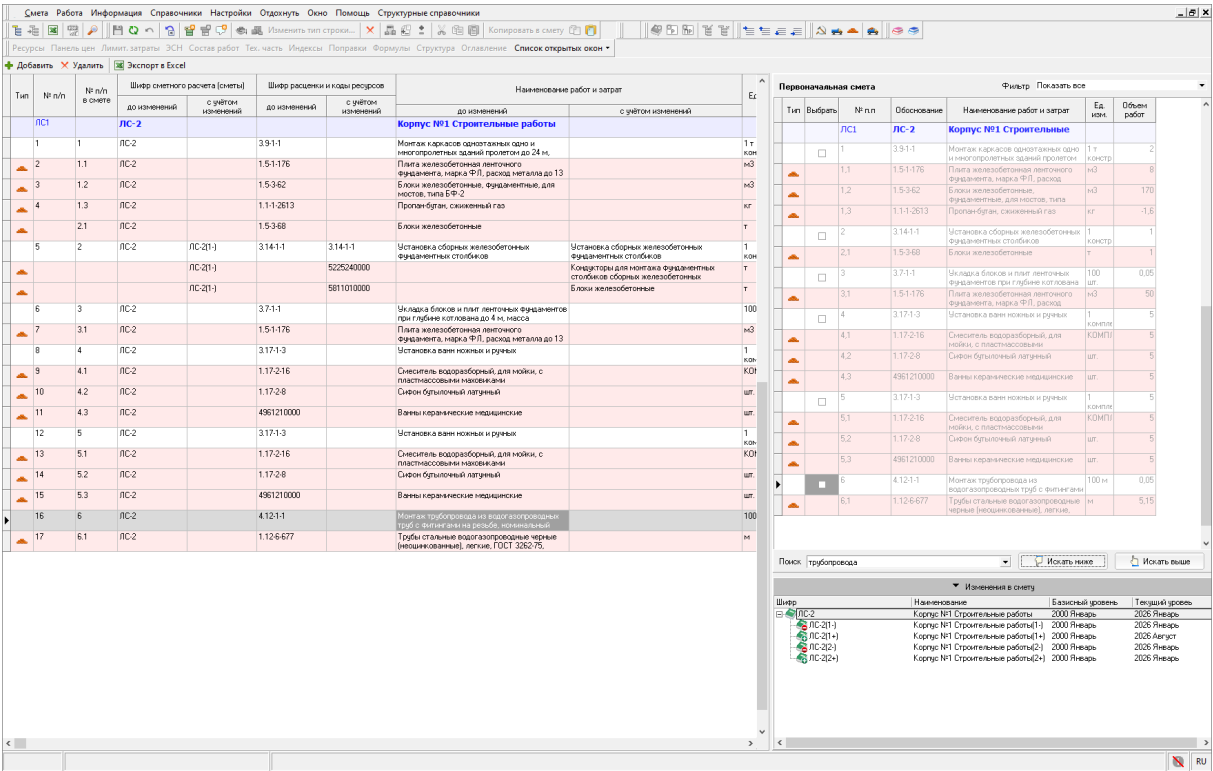

Рабочая область ведомости при первом открытии содержит сметные строки из исходной сметы.

В том случае, если позиции в сметы на изменение были добавлены путем перетаскивания из исходной сметы или у этой сметы уже ранее была добавлена сопоставительная ведомость, связи таких позиций уже будут сформированы, при необходимости, их можно изменить.

Таблица сопоставительной ведомости включает в себя данные о шифрах сметных расчетов, шифрах расценок, наименовании работ и затрат и объем работ в сметной документации на принятый измеритель работ и затрат до изменений и с учетом изменений, обоснование изменений и ссылки на техническую документацию

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отладить Окно Помощь Структурные справочники																			
Ресурсы Панель цен Лимит. затраты ЭСН Состав работ Тех. часть Индексы Поправки Формулы Структура Отслеживание Список открытых окон																			
Добавить Удалить Экспорт в Excel																			
Тип	№ п/п в смете	Шифр сметного расчета (сметы)		Шифр расценок и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на принятый измеритель работ и затрат			Сметная стоимость, руб.			Разница стоимости с учетом изменений	Обоснование изменений	Ссылка на техническую документацию		
		до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений				до изменений	увеличение	снижение	до изменений	увеличение	снижение			до изменений	с учетом изменений	
ПС	ПС-2	Корпус №1 Строительные																	
	1	1	ПС-2	3.91-1		Монтаж каркасов одноэтажных зданий и многоэтажных зданий		1 т	конструкц	2		2	1 943.36		1 943.36		Чертежи № КЛ - 1249		
	2	1.1	ПС-2	1.51-176		Плита железобетонная ленточного фундамента, марка		м3		8		8	8 908.32		8 908.32		Чертежи № КЛ - 1241		
	3	1.2	ПС-2	1.53-62		Блоки железобетонные, фундаментные, для постов, типа		м3		170		170	760 869		760 869		Чертежи № КЛ - 1241		
	4	1.3	ПС-2	1.11-2613		Пропан-бутан, сжиженный газ		кг		-1.6		-1.6	-10		-10		Чертежи № КЛ - 1241		
	5	2	ПС-2	3.141-1		Установка сборных железобетонных фундаментных		1	конструкц	1		1	36.41		36.41		Чертежи № КЛ - 1249		
	6	2.1	ПС-2	1.53-68		Блоки железобетонные		т		1		1	0		0		Чертежи № КЛ - 1241		
	7	3	ПС-2	3.71-1		Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине		100 шт.		0.05		0.05	124.96		124.96		Чертежи № КЛ - 1241		
	8	3.1	ПС-2	1.51-176		Плита железобетонная ленточного фундамента, марка		м3		50		50	53 177		53 177		Чертежи № КЛ - 1241		
	9	4	ПС-2	3.171-3		Установка вали нольки и ручья		1 комплект		5		5	835.42		835.42		Чертежи № КЛ - 1241		
	10	4.1	ПС-2	1.172-16		Смеситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми		КОМПЛЕК		5		5	468		468		Чертежи № КЛ - 1241		
	11	4.2	ПС-2	1.172-8		Сирок бутылочный латунный		шт.		5		5	460.55		460.55		Чертежи № КЛ - 1241		
	12	4.3	ПС-2	4.86121000		Ванна керамическая напольная		шт.		5		5	0		0		Чертежи № КЛ - 1241		
	13	5	ПС-2	3.171-3		Установка вали нольки и ручья		1 комплект		5		5	835.42		835.42		Чертежи № КЛ - 1241		
	14	5.1	ПС-2	1.172-16		Смеситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми		КОМПЛЕК		5		5	468		468		Чертежи № КЛ - 1241		
	15	5.2	ПС-2	1.172-8		Сирок бутылочный латунный		шт.		5		5	460.55		460.55		Чертежи № КЛ - 1241		
	16	5.3	ПС-2	4.86121000		Ванна керамическая напольная		шт.		5		5	0		0		Чертежи № КЛ - 1241		
	17	6	ПС-2	4.121-1		Монтаж трубопровода на водозаборных труб с		100 м		0.05		0.05	156.72		156.72		Чертежи № КЛ - 1241		
	18	6.1	ПС-2	1.126-677		Трубы стальные водозаборные черные		м		5.15		5.15	15.71		15.71		Чертежи № КЛ - 1241		

После установки связей строк сопоставительной ведомости и смет на изменение для каждой позиции можно увидеть данные до изменений, увеличение или снижение, значение с учетом изменений и разницу стоимости

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отладить

Окно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы

Панель цен

Лимит. затраты

ЭСН

Состав работ

Тех. часть

Индексы

Поправки

Формулы

Структура

Отслеживание

Список открытых окон

Добавить

Удалить

Экспорт в Excel

Тип	№ п/п	в смете	Шифр сметного расчета (сметы)		Шифр расценок и коды ресурсов		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на принятый измеритель работ и затрат			Сметная стоимость, руб.			Разница стоимости с учетом изменений	Обосн. изм.
			до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений			до изменений	увеличение	снижение	до изменений	увеличение	снижение		
			ПС-2				Корпус №1 Строительные									
	1	1	ПС-2		3.91-1		Монтаж каркасов одноэтажных зданий и многоэтажных зданий	1 т	конструкц	2		2	1 943.36		1 943.36	
	2	1.1	ПС-2		1.51-176		Плита железобетонная ленточного фундамента, марка	м3		8		8	8 908.32		8 908.32	
	3	1.2	ПС-2		1.53-62		Блоки железобетонные фундаментные, для постов, типа	м3		170		170	760 869		760 869	
	4	1.3	ПС-2		1.11-2613		Пропан-бутан, сжиженный газ	кг		-1.6		-1.6	-10		-10	
	5	2	ПС-2		3.141-1		Установка сборных железобетонных фундаментных	1	конструкц	1		1	36.41		36.41	
	6	2.1	ПС-2		1.53-68		Блоки железобетонные	т		1		1	0		0	
	7	3	ПС-2		3.71-1		Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине	100 шт.		0.05		0.05	124.96		124.96	
	8	3.1	ПС-2		1.51-176		Плита железобетонная ленточного фундамента, марка	м3		50		50	53 177		53 177	
	9	4	ПС-2		3.171-3		Установка вали нольки и ручья	1 комплект		5		5	835.42		835.42	
	10	4.1	ПС-2		1.172-16		Смеситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми	КОМПЛЕК		5		5	468		468	
	11	4.2	ПС-2		1.172-8		Сирок бутылочный латунный	шт.		5		5	460.55		460.55	
	12	4.3	ПС-2		4.86121000		Ванна керамическая напольная	шт.		5		5	0		0	
	13	5	ПС-2		3.171-3		Установка вали нольки и ручья	1 комплект		5		5	835.42		835.42	
	14	5.1	ПС-2		1.172-16		Смеситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми	КОМПЛЕК		5		5	468		468	
	15	5.2	ПС-2		1.172-8		Сирок бутылочный латунный	шт.		5		5	460.55		460.55	
	16	5.3	ПС-2		4.86121000		Ванна керамическая напольная	шт.		5		5	0		0	
	17	6	ПС-2		4.121-1		Монтаж трубопровода на водозаборных труб с	100 м		0.05		0.05	156.72		156.72	
	18	6.1	ПС-2		1.126-677		Трубы стальные водозаборные черные	м		5.15		5.15	15.71		15.71	

Персонажи

Показать все

Тип	Выбор	№ п.п	Обоснование	Наимен
	☐	1	3.91-1	Монтаж кар
	☐	1.1	1.51-176	Плита желе
	☐	1.2	1.53-62	Блоки желе
	☐	1.3	1.11-2613	Пропан-буг
	☐	2	3.141-1	Установка б
	☐	2.1	1.53-68	Блоки желе
	☐	3	3.71-1	Укладка бл
	☐	3.1	1.51-176	Плита желе
	☐	4	3.171-3	Установка в
	☐	4.1	1.172-16	Смеситель в
	☐	4.2	1.172-8	Сирок бутл
	☐	4.3	4.86121000	Ванна кера
	☐	5	3.171-3	Установка в
	☐	5.1	1.172-16	Смеситель в
	☐	5.2	1.172-8	Сирок бутл
	☐	5.3	4.86121000	Ванна кера
	☐	6	4.121-1	Монтаж тру
	☐	6.1	1.126-677	Трубы стал

Искать нижеИскать выше

Изменения в смете

Шифр	Наименование
ПС-2	Корпус №1 Строительные
ПС-2(1)	Корпус №1 Строительные
ПС-2(1)	Корпус №1 Строительные
ПС-2(2)	Корпус №1 Строительные
ПС-2(2)	Корпус №1 Строительные

Если позиция была изменена несколько раз, ведомость показывает цепочку изменений последовательно. Это позволяет проследить, как одна и та же строка менялась от корректировки к корректировке

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отладить Окно Помощь Структурные справочники														
Ресурсы Панель цен Лимит затрат ЭСН Состав работ Тек. часть Индексы Поправки Формулы Структура Отладивание Список открытых окон														
Добавить Удалить Экспорт в Excel														
Смета на добавление Фильтр Показать все														
Тип	№ п/п в смете	Шир сметного расчета (сметы)	до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на принятый интервал работ и затрат	до изменений	увеличение	Смет	Тип	Выбор
3	3	ЛС-2	ЛС-2(2+)	3.7-1	3.7-1		Укладка блоков и плит ленточного фундамента при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0.5 т	100 шт.	0.05	0.05	0.1	124.96	1	ЛС1
4	3.1	ЛС-2	ЛС-2(2+)	1.5-1-176	1.5-1-176		Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФЛ, расклад металла до 13 кг	м3	50	50	100	53.177	2	ЛС-2(2+)
5	3	ЛС-2	ЛС-2(1-)	3.7-1	3.7-1		Укладка блоков и плит ленточного фундамента при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0.5 т	100 шт.	0.05	0.05	0.13	124.96	3	ЛС-2(1-)
6	3.1	ЛС-2	ЛС-2(1-)	1.5-1-176	1.5-1-176		Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФЛ, расклад металла до 13 кг	м3	50	8	58	53.177	4	ЛС-2(1-)
7	4	ЛС-2		3.17-3			Установка ввинтовых и ручных	1 комплект	5		5	635.42	5	ЛС-2
8	4.1	ЛС-2		1.17-2.16			Смеситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми насадками	КОМПЛЕК	5		5	468	6	ЛС-2
9	4.2	ЛС-2		1.17-2.8			Сирок брызгочный латунный	шт.	5		5	460.95	7	ЛС-2
10	4.3	ЛС-2		4.961210000			Ванна керамическая накладная	шт.	5		5	0	8	ЛС-2
11	5	ЛС-2		3.17-3			Установка ввинтовых и ручных	1 комплект	5		5	635.42	9	ЛС-2

При необходимости отображения примечаний к расценкам, добавленных в смету, нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Показать примечания"

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отладить Окно Помощь Структурные справочники														
Ресурсы Панель цен Лимит затрат ЭСН Состав работ Тек. часть Индексы Поправки Формулы Структура Отладивание Список открытых окон														
Добавить Удалить Экспорт в Excel														
Смета на исключение Фильтр Показать все														
Тип	№ п/п в смете	Шир сметного расчета (сметы)	до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на принятый интервал работ и затрат	до изменений	увеличение	Смет	Тип	Выбор
2.1		ЛС-2	ЛС-2(1-)	3.14-1	3.14-1-1		Установка сборных железобетонных фундаментных столбов	1 конструкция	1		5	36.41	1	ЛС1
2	2	ЛС-2	ЛС-2(1-)	5.25240000			Кондукторы для монтажа сборных железобетонных фундаментных столбов	т	0.0025	0.0025			2	ЛС-2(1-)
3	3	ЛС-2		3.7-1			Укладка блоков и плит ленточного фундамента при глубине котлована до 0.5 т	100 шт.	0.05		0.05	124.96	3	ЛС-2
4	3.1	ЛС-2		1.5-1-176			Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФЛ, расклад металла до 13 кг	м3	50		50	53.177	4	ЛС-2
5	4	ЛС-2		3.17-3			Установка ввинтовых и ручных	1 комплект	5		5	635.42	5	ЛС-2
6	4.1	ЛС-2		1.17-2.16			Смеситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми насадками	КОМПЛЕК	5		5	468	6	ЛС-2
7	4.2	ЛС-2		1.17-2.8			Сирок брызгочный латунный	шт.	5		5	460.95	7	ЛС-2
8	4.3	ЛС-2		4.961210000			Ванна керамическая накладная	шт.	5		5	0	8	ЛС-2
9	5	ЛС-2		3.17-3			Установка ввинтовых и ручных	1 комплект	5		5	635.42	9	ЛС-2
10	5.1	ЛС-2		1.17-2.16			Смеситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми насадками	КОМПЛЕК	5		5	468	10	ЛС-2
11	5.2	ЛС-2		1.17-2.8			Сирок брызгочный латунный	шт.	5		5	460.95	11	ЛС-2
12	5.3	ЛС-2		4.961210000			Ванна керамическая накладная	шт.	5		5	0	12	ЛС-2
13	6	ЛС-2		4.12-1-1			Монтаж трубопровода из высокопрочной трубы с вытеснением на резьбе, номинальный диаметр труб	100 м	0.05		0.05	156.72	13	ЛС-2
14	6.1	ЛС-2		1.126-677			Трубы стальные высокопрочные черные (неокрашенные), ленточные, ГОСТ 3062-79, диаметр	м	5.15		5.15	15.71	14	ЛС-2

В колонке "Наименование работ и затрат до изменений" отображаются примечания к наименованиям из исходной сметы, а в колонке "Наименование работ и затрат с учетом изменений" - из смет на изменения

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Оено Помощь Структурные справочники														
Ресурсы Панель цен Лимит затрат ЭСН Состав работ Тек. часть Индексы Поправки Формулы Структура Отслеживание Список открытых окон														
Добавить Удалить Экспорт в Excel														
Тип	№ п/п в смете	Шир. расцены (сметы)		Шир. расцены и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на принятый издержатель работ и затрат		Сметная стоимость, руб.		F	оп
		до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений		до изменений	увеличение	снижение	до изменений	увеличение	
	2.1	ПС-2		1.5-3.68		Блоки железобетонные		т	1			1	0	
	2	ПС-2	ПС-2(1-)	3.14-1.1	3.14-1.1	Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков		1	конструкция	1	5	6	36.41	
			ПС-2(1-)	5225240000		Кондукторы для монтажа сборных железобетонных фундаментных столбиков (5225240000, 5225240000)		т		0.0025		0.0025		
			ПС-2(1-)	5811010000		Блоки железобетонные		т		5		5		
	3	ПС-2		3.7-1.1		Укладка блоков и плит ленточного фундамента при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0.5 т		100 шт.	0.05			0.05	124.96	
	4	3.1	ПС-2	1.5-1.76		Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФП, расход металла до 13 кг		м3	50			50	53.177	
	5	4	ПС-2	3.17-1.3		Установка вагон конышек и ручья		1 комплект	5			5	835.42	
	6	4.1	ПС-2	1.17-2.16		Смесь для водоразборной, для мойки, с пластмассовыми насадками		КОМПЛЕКС	5			5	468	
	7	4.2	ПС-2	1.17-2.8		Сирок бутылочный латунный		шт.	5			5	460.55	

Смета на исключение

Филтр Показать все

Тип	Выбор	№ п.п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	0	1
		1	3.7-1.1	Укладка блоков и плит ленточного фундамента при глубине котлована до 4 м	шт.	100	
		1.1	1.5-1.76	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФП, расход	м3		
		2	3.14-1.1	Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков	1	констр	
		2.1	5225240000	Кондукторы для монтажа фундаментных столбиков	т		
		2.2	5811010000	Блоки железобетонные	т		
		3	3.8-1.1	Устройство песчаного основания под фундамента	1	м3	
		3.1	1.1-1.766	Песок для строительных работ, равной (карьерный)	м3		

Поиск

Обоснование или наименование

Искать ниже

Искать выше

Изменения в смете

Широ	Наименование	Базисный уровень	1
ПС-2	Корпус НТ Строительные работы	2000 Январь	2
ПС-2(1-)	Корпус НТ Строительные работы(1-)	2000 Январь	2
ПС-2(1+)	Корпус НТ Строительные работы(1+)	2000 Январь	2
ПС-2(2-)	Корпус НТ Строительные работы(2-)	2000 Январь	2
ПС-2(2+)	Корпус НТ Строительные работы(2+)	2000 Январь	2

Строки-комментарии

При формировании сопоставительной ведомости объемов работ, строки-комментарии из основной (первоначальной) локальной сметы будут добавлены автоматически и расположены в порядке следования строк в смете.

В документ также можно добавить новые строки-комментарии. Для добавления нажмите на панели инструментов "Добавить" - "Комментарии" или нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Добавить строку - комментарий"

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Оено Помощь Структурные справочники														
Ресурсы Панель цен Лимит затрат ЭСН Состав работ Тек. часть Индексы Поправки Формулы Структура Отслеживание Список открытых окон														
Добавить Удалить Экспорт в Excel														
Тип	№ п/п в смете	Шир. расцены (сметы)		Шир. расцены и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на принятый издержатель работ и затрат		Сметная стоимость, руб.		F	оп
		до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений		до изменений	увеличение	снижение	до изменений	увеличение	
	1.1	ПС-2		1.5-1.76		Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФП, расход металла до 13 кг		м3	8			8	8 508.32	
	1.2	ПС-2		1.5-3.62		Блоки железобетонные, фундаментные, для мостов, типа ФП-2		м3	170			170	760 869	
	1.3	ПС-2		1.1-1.2613		Пропан-бутан, сжиженный газ		кг	-1.6			-1.6	-10	
	1	ПС-2	ПС-2(1+)	3.9-1.1	3.9-1.1	Монтаж каркасов одноэтажных и многоэтажных зданий, пролетом до 24 м, высотой		1 т	конструкция	2	22	24	1 943.36	21 443.03
			ПС-2(1+)	5261520000		Стальные конструкции каркаса		т				22	0	
	2.1	ПС-2		1.5-3.68		Блоки железобетонные		т				1	0	
	2	ПС-2	ПС-2(1-)	3.14-1.1	3.14-1.1	Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков		1	конструкция	1	5	6	36.41	218.45
			ПС-2(1-)	5225240000		Кондукторы для монтажа фундаментных столбиков (5225240000, 5225240000)		т		0.0025		0.0025	0	
			ПС-2(1-)	5811010000		Блоки железобетонные		т		5		5	0	
	3	ПС-2	ПС-2(2+)	3.7-1.1	3.7-1.1	Укладка блоков и плит ленточного фундамента при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0.5 т		100 шт.	0.05			0.1	124.96	249.92
	4	3.1	ПС-2	1.5-1.76	1.5-1.76	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФП, расход металла до 13 кг		м3	50			100	53.177	106.354
	5	4	ПС-2	3.17-1.3		Установка вагон конышек и ручья		1 комплект	5			5	835.42	
	6	4.1	ПС-2	1.17-2.16		Смесь для водоразборной, для мойки, с пластмассовыми насадками		КОМПЛЕКС	5			5	468	
	7	4.2	ПС-2	1.17-2.8		Сирок бутылочный латунный		шт.	5			5	460.55	
	8	4.3	ПС-2	4.961210000		Вашины карманные гидравлические		шт.	5			5	0	

Смета на исключение

Филтр Показать все

Тип	Выбор	№ п.п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	0	1
		1	3.15-1.1	Облицовка с полировкой	шт.		
		1.1	1.7-3.4	Диск отрезной алмазный	шт.		
		1.2	1.1-1.235	Плита грани	шт.		
		2	3.9-1.1	Монтаж кар	шт.		
		2.1	5261520000	Стальные кс	т		
		3	3.4-1.1	Коробовые	шт.		
		3.1	1.12-7.183	Трубы бур	шт.		
		3.2	1.12-7.183	Трубы бур	шт.		
		3.3	1.1-1.183	Дилем бр	шт.		

Поиск

Искать ниже

Искать выше

Изменения в смете

Широ	Наименование	Базисный уровень	1
ПС-2	Корпус НТ Строительные	2000 Январь	2
ПС-2(1-)	Корпус НТ Строительные	2000 Январь	2
ПС-2(1+)	Корпус НТ Строительные	2000 Январь	2
ПС-2(2-)	Корпус НТ Строительные	2000 Январь	2
ПС-2(2+)	Корпус НТ Строительные	2000 Январь	2

Строки-комментарии используются для пояснений и имеют индикатор в колонке "Тип". Для внесения комментария нажмите в колонке "Наименование работ и затрат" - "с учетом изменений" и внесите текст

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Открытые

Оформление

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы | Панель цен | Лимиты затрат | ЭСН | Состав работ | Тек. часть | Индексы | Поправки | Формулы | Структура | Отслеживание | Копировать в смету | Список открытых окон

Добавить

Удалить

Экспорт в Excel

Тип	№ п/п в смете	Широкое наименование работ и затрат (сметы)		Широкое наименование работ и затрат (сметы)	Широкое наименование работ и затрат (сметы)	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на принятый интервал работ и затрат			Сметная стоимость, руб.			f	sp	i	is	
		до изменений	с учетом изменений				до изменений	с учетом изменений	до изменений	увеличение	снижение	с учетом изменений					
	1.1	ПС-2	1.5-1-176	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФВЛ, расход металла до 13 кг	м3	8			8	8 508,32			8 508,32				
	1.2	ПС-2	1.5-3-62	Блоки железобетонные, фундаментные, для мостов, типа БФ-2	м3	170			170	760 869			760 869				
	1.3	ПС-2	1.1-1-2613	Пропан-бутан, сжиженный, газ	кг	-1,6			-1,6	-10			-10				
	1	1	ПС-2	ПС-2(1+)	3.9-1-1	3.9-1-1	Монтаж каркасов одноплатных одно и многопролетных зданий (пролеты до 24 м, высотой)	Монтаж каркасов одноплатных одно и многопролетных зданий (пролеты до 24 м, высотой)	т	22	22	24	1 943,36	21 443,03		23 382,39	
					ПС-2(1+)	5261600000	Стальные конструкции каркаса	Стальные конструкции каркаса	т	22	22		0			0	
	2.1	ПС-2	1.5-3-68	Блоки железобетонные	т	1			1	0			0			0	
	2	2	ПС-2	ПС-2(1-)	3.14-1-1	3.14-1-1	Установка сборных железобетонных фундаментных стоек (при необходимости)	Установка сборных железобетонных фундаментных стоек	1 конструкция	1	5	6	36,41	182,04		218,45	
					ПС-2(1-)	5252400000	Кондукторы для монтажа фундаментных стоек (С235000000, С231000000)	Кондукторы для монтажа фундаментных стоек	т	0,0025	0,0025		0			0	
					ПС-2(1-)	58110100000	Блоки железобетонные	Блоки железобетонные	т	5	5		0			0	
	3	3	ПС-2	ПС-2(2+)	3.7-1-1	3.7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	100 шт.	0,05	0,05	0,1	124,96	124,96		249,92	
	4	3.1	ПС-2	ПС-2(2+)	1.5-1-176	1.5-1-176	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФВЛ, расход металла до 13 кг	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФВЛ, расход металла до 13 кг	м3	50	50	100	53 177	53 177		106 354	
	5	4	ПС-2		3.17-1-3		Установка вент. коробов и решетки	Установка вент. коробов и решетки	1 комплект	5		5	835,42			835,42	
	6	4.1	ПС-2		1.17-2-16		Смонтировать водоразборный, для мойки, с пластмассовыми наконечниками	Смонтировать водоразборный, для мойки, с пластмассовыми наконечниками	КОМПЛЕКТ	5		5	468			468	
	7	4.2	ПС-2		1.17-2-8		Смонтировать бытовые лампы	Смонтировать бытовые лампы	шт.	5		5	460,55			460,55	
	8	4.3	ПС-2		4.961210000		Ванна керамическая лавандовая	Ванна керамическая лавандовая	шт.	5		5	0			0	

Смета на изменение

Показать все

Тип	Выбор	№ п/п	Обоснование	Наименование
		1	3.7-1-1	Укладка бл. фундамента
		1.1	1.5-1-176	Плита железобетонная
		2	3.14-1-1	Установка с фундамента
		2.1	5252400000	Кондукторы фундамента
		2.2	58110100000	Блоки железобетонные
		3	3.8-1-1	Устройство фундамента
		3.1	1.1-1-768	Посадка для с фундамента (кв)

Искать ниже

Искать выше


Изменения в смету

Широкое наименование работ и затрат (сметы)	Наименование работ и затрат (сметы)
ПС-2	Корпус М1 Строительный
ПС-2(1+)	Корпус М1 Строительный
ПС-2(1-)	Корпус М1 Строительный
ПС-2(2+)	Корпус М1 Строительный


Связи строк ведомости и сметы

Связь устанавливается между главными строками сопоставительной ведомости и главными строками сметы.


При выделении связанной строки в сопоставительной ведомости, в правой части автоматически открывается соответствующая смета на изменение с выделением этой строки. Также данная смета выделяется в секции "Изменения в смету"

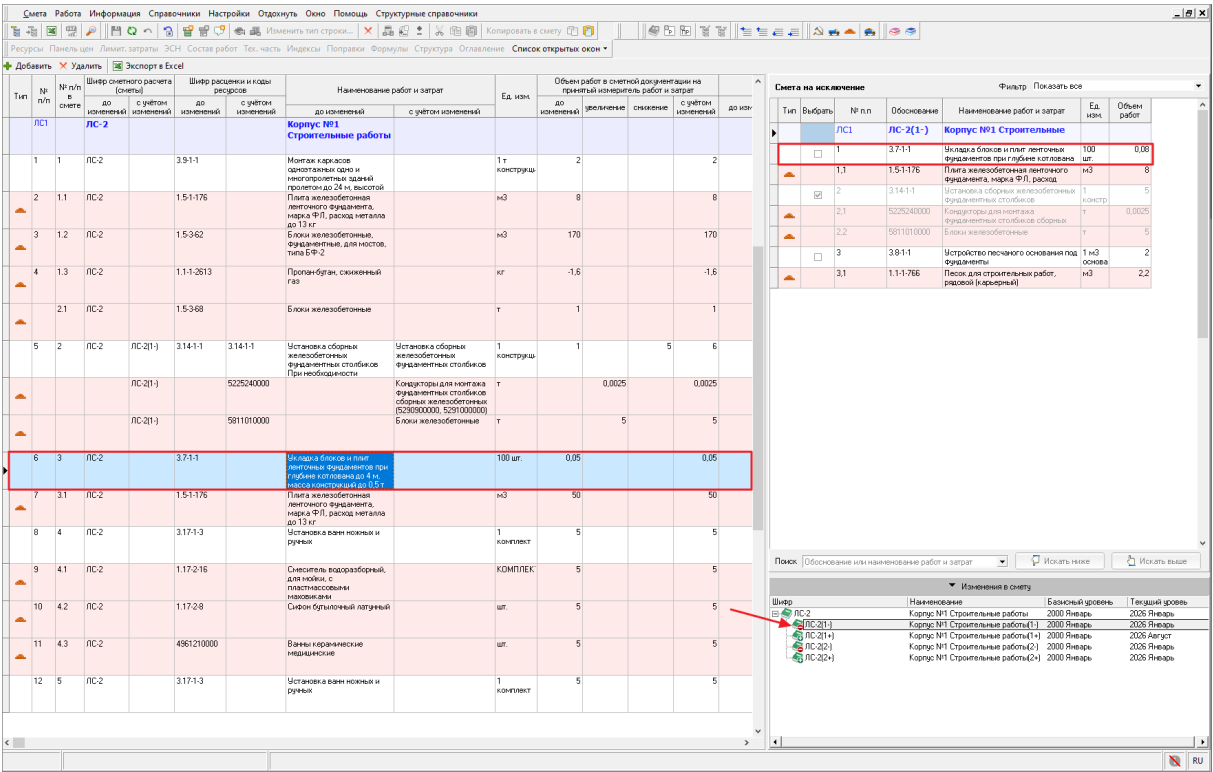


Для установки связи выберите строку сопоставительной ведомости, после этого в правой части в секции "Изменения в смету" выберите нужную смету,

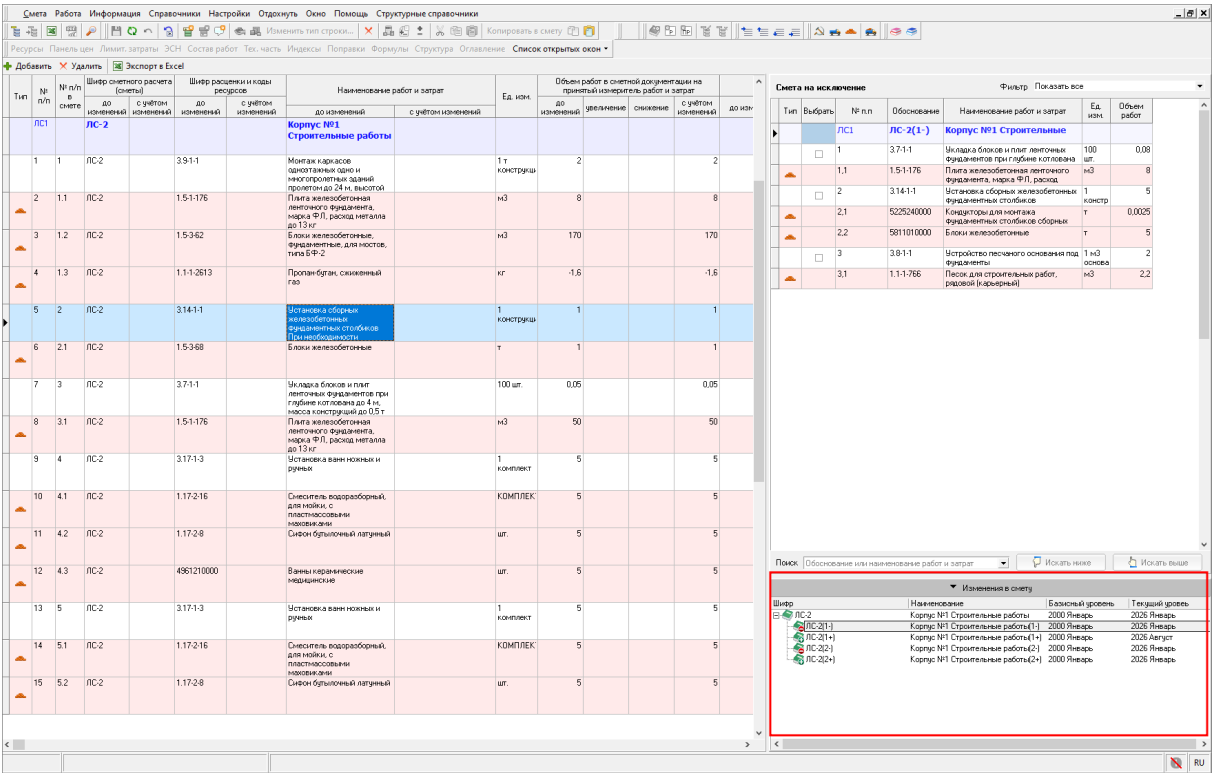

И в нужной строке сметы установите флажок в колонке "Выбрать"

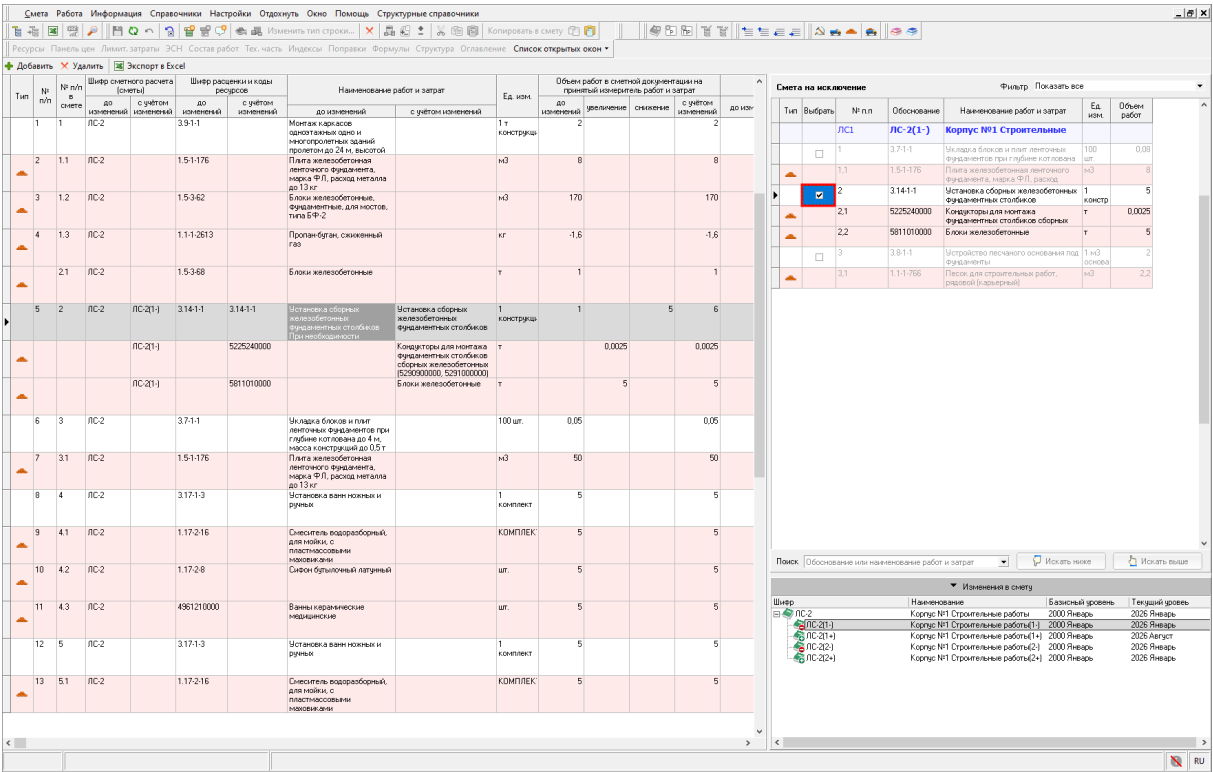

После установки связи данные автоматически переносятся в таблицу сопоставительной ведомости

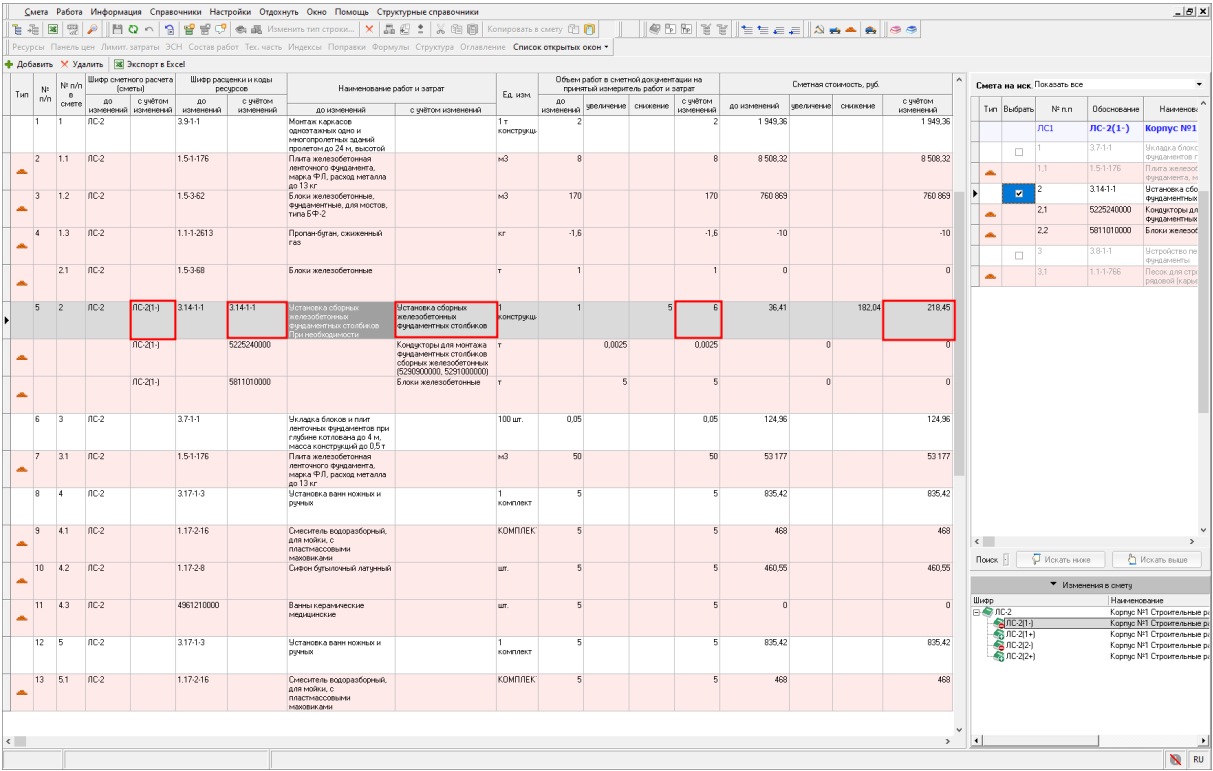

Строка сопоставительной ведомости не может быть одновременно связана с двумя сметами одного комплекта изменений. Строки сметы уже имеющие связь неактивны.

Вид выбранной сметы отображается вверху окна: Первоначальная смета, Смета на добавление или Смета на исключение

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Одно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы: Панель цен, Лимит, затраты, ЭСН, Состав работ, Тех. часть, Индексы, Поправки, Формулы, Структура, Отслеживание, Список открытых окон

Добавить

Удалить

Экспорт в Excel

Тип	№ п/п в смете	№ п/п в смете	Шир расцены и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на принятый объем работ и затрат		Сметная	
			до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений		до изменений	увеличение	до изменений	увеличение
1	1	ПС-2	3.91-1		Монтаж каркаса фундаментов одно и многопролетных зданий пролетом до 24 м, высотой 1.5-1.76	т	конструк	2		2	1 949.36
2	1.1	ПС-2	1.51-176		Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФП, расклад металл до 13 кг	м3		8		8	8 508.32
3	1.2	ПС-2	1.53-62		Блоки железобетонные, фундаментные, для мостов, типа БФ-2	м3		170		170	760 869
4	1.3	ПС-2	1.11-2613		Пропан-бутан, сжиженный газ	кг		-1.6		-1.6	-10
	2.1	ПС-2	1.53-68		Блоки железобетонные	т		1		1	0
5	2	ПС-2	ПС-2(1)	3.141-1	3.141-1	1	конструк	1		5	36.41
			ПС-2(1)	5225240000		Консоль для монтажа фундаментных стоек	т		0.0025	0.0025	
			ПС-2(1)	5611010000		Блоки железобетонные	т		5	5	
6	3	ПС-2	3.71-1		Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0.5 т	100 шт.		0.05		0.05	124.96
7	3.1	ПС-2	1.51-176		Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФП, расклад металл до 13 кг	м3		50		50	53 177
8	4	ПС-2	3.171-3		Установка в вань коныки и ручья	1 комплект		5		5	835.42
9	4.1	ПС-2	1.17-216		Смеситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми наконечниками	КОМПЛЕК		5		5	468
10	4.2	ПС-2	1.17-28		Сифон бытового лагуны	шт.		5		5	460.95
11	4.3	ПС-2	4961210000		Вань керамические напольные	шт.		5		5	0
12	5	ПС-2	3.171-3		Установка в вань коныки и ручья	1 комплект		5		5	835.42
13	5.1	ПС-2	1.17-216		Смеситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми наконечниками	КОМПЛЕК		5		5	468

Первоначальная смета

Филтр

Показать все

Тип	Выбор	№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	0	1
1	1	3.91-1	ПС-2	Корпус №1 Строительные работы	1 т	констр	
1.1	1.1	1.51-176	ПС-2(1)	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФП, расклад	м3		
1.2	1.2	1.53-62	ПС-2(1)	Блоки железобетонные, фундаментные, для мостов, типа	м3		
1.3	1.3	1.11-2613	ПС-2(1)	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг		
2	2	3.141-1	ПС-2(1)	Установка сборных железобетонных фундаментных стоек	1	констр	
2.1	2.1	1.53-68	ПС-2(1)	Блоки железобетонные	т		
3	3	3.71-1	ПС-2(1)	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована	100	шт.	
3.1	3.1	1.51-176	ПС-2(1)	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФП, расклад	м3		
4	4	3.171-3	ПС-2(1)	Установка в вань коныки и ручья	1	компл	
4.1	4.1	1.17-216	ПС-2(1)	Смеситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми	КОМПЛЕ		
4.2	4.2	1.17-28	ПС-2(1)	Сифон бытового лагуны	шт.		
4.3	4.3	4961210000	ПС-2(1)	Вань керамические напольные	шт.		
5	5	3.171-3	ПС-2(1)	Установка в вань коныки и ручья	1	компл	
5.1	5.1	1.17-216	ПС-2(1)	Смеситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми	КОМПЛЕ		
5.2	5.2	1.17-28	ПС-2(1)	Сифон бытового лагуны	шт.		
5.3	5.3	4961210000	ПС-2(1)	Вань керамические напольные	шт.		
6	6	4121-1	ПС-2(1)	Монтаж трубопровода на	100	м	
6.1	6.1	1126677	ПС-2(1)	Трубы стальные водопроводные на			

Поиск

Обоснование или наименование

Искать ниже

Искать выше

Изменения в смете

Шир	Наименование	Базисный уровень	Т
ПС-2	Корпус №1 Строительные работы	2000 Январь	2
ПС-2(1)	Корпус №1 Строительные работы(1)	2000 Январь	2
ПС-2(1)	Корпус №1 Строительные работы(1)	2000 Январь	2
ПС-2(1)	Корпус №1 Строительные работы(2)	2000 Январь	2
ПС-2(1)	Корпус №1 Строительные работы(2)	2000 Январь	2

Поле "Филтр" позволяет выбрать вариант отображения строк в смете:

- Показать все - отображает все строки в выбранной смете,
- Скрыть строки, добавленные в СВОР - отображает все строки сметы без связей,
- Подобрать по обоснованию - отображает строки сметы, у которых значение в колонке "Обоснование" совпадает со значением в колонке "Обоснование" строки сопоставительной ведомости

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отдохнуть

Одно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы: Панель цен, Лимит, затраты, ЭСН, Состав работ, Тех. часть, Индексы, Поправки, Формулы, Структура, Отслеживание, Список открытых окон

Добавить

Удалить

Экспорт в Excel

Тип	№ п/п в смете	№ п/п в смете	Шир расцены и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на принятый объем работ и затрат		Сметная	
			до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений		до изменений	увеличение	до изменений	увеличение
1	1	ПС-2	3.91-1		Монтаж каркаса фундаментов одно и многопролетных зданий пролетом до 24 м, высотой 1.5-1.76	т	конструк	2		2	1 949.36
2	1.1	ПС-2	1.51-176		Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФП, расклад металл до 13 кг	м3		8		8	8 508.32
3	1.2	ПС-2	1.53-62		Блоки железобетонные, фундаментные, для мостов, типа БФ-2	м3		170		170	760 869
4	1.3	ПС-2	1.11-2613		Пропан-бутан, сжиженный газ	кг		-1.6		-1.6	-10
	2.1	ПС-2	1.53-68		Блоки железобетонные	т		1		1	0
5	2	ПС-2	ПС-2(1)	3.141-1	3.141-1	1	конструк	1		5	36.41
			ПС-2(1)	5225240000		Консоль для монтажа фундаментных стоек	т		0.0025	0.0025	
			ПС-2(1)	5611010000		Блоки железобетонные	т		5	5	
6	3	ПС-2	3.71-1		Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0.5 т	100 шт.		0.05		0.05	124.96
7	3.1	ПС-2	1.51-176		Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФП, расклад металл до 13 кг	м3		50		50	53 177
8	4	ПС-2	3.171-3		Установка в вань коныки и ручья	1 комплект		5		5	835.42
9	4.1	ПС-2	1.17-216		Смеситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми наконечниками	КОМПЛЕК		5		5	468
10	4.2	ПС-2	1.17-28		Сифон бытового лагуны	шт.		5		5	460.95
11	4.3	ПС-2	4961210000		Вань керамические напольные	шт.		5		5	0
12	5	ПС-2	3.171-3		Установка в вань коныки и ручья	1 комплект		5		5	835.42
13	5.1	ПС-2	1.17-216		Смеситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми наконечниками	КОМПЛЕК		5		5	468

Первоначальная смета

Филтр

Показать все

Тип	Выбор	№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	0	1
1	1	3.91-1	ПС-2	Корпус №1 Строительные работы	1 т	констр	
1.1	1.1	1.51-176	ПС-2(1)	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФП, расклад	м3		
1.2	1.2	1.53-62	ПС-2(1)	Блоки железобетонные, фундаментные, для мостов, типа	м3		
1.3	1.3	1.11-2613	ПС-2(1)	Пропан-бутан, сжиженный газ	кг		
2	2	3.141-1	ПС-2(1)	Установка сборных железобетонных фундаментных стоек	1	констр	
2.1	2.1	1.53-68	ПС-2(1)	Блоки железобетонные	т		
3	3	3.71-1	ПС-2(1)	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована	100	шт.	
3.1	3.1	1.51-176	ПС-2(1)	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФП, расклад	м3		
4	4	3.171-3	ПС-2(1)	Установка в вань коныки и ручья	1	компл	
4.1	4.1	1.17-216	ПС-2(1)	Смеситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми	КОМПЛЕ		
4.2	4.2	1.17-28	ПС-2(1)	Сифон бытового лагуны	шт.		
4.3	4.3	4961210000	ПС-2(1)	Вань керамические напольные	шт.		
5	5	3.171-3	ПС-2(1)	Установка в вань коныки и ручья	1	компл	
5.1	5.1	1.17-216	ПС-2(1)	Смеситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми	КОМПЛЕ		
5.2	5.2	1.17-28	ПС-2(1)	Сифон бытового лагуны	шт.		
5.3	5.3	4961210000	ПС-2(1)	Вань керамические напольные	шт.		
6	6	4121-1	ПС-2(1)	Монтаж трубопровода на	100	м	
6.1	6.1	1126677	ПС-2(1)	Трубы стальные водопроводные на			

Поиск

Обоснование или наименование

Искать ниже


Искать выше

Изменения в смете

Шир	Наименование	Базисный уровень	Т
ПС-2	Корпус №1 Строительные работы	2000 Январь	2
ПС-2(1)	Корпус №1 Строительные работы(1)	2000 Январь	2
ПС-2(1)	Корпус №1 Строительные работы(1)	2000 Январь	2
ПС-2(1)	Корпус №1 Строительные работы(2)	2000 Январь	2
ПС-2(1)	Корпус №1 Строительные работы(2)	2000 Январь	2

Поле "Поиск" позволяет искать расценки в выбранной смете. Поиск осуществляется последовательно по обоснованию и наименованию расценки.

Для поиска введите искомый фрагмент и нажмите "Искать ниже" или "Искать выше"

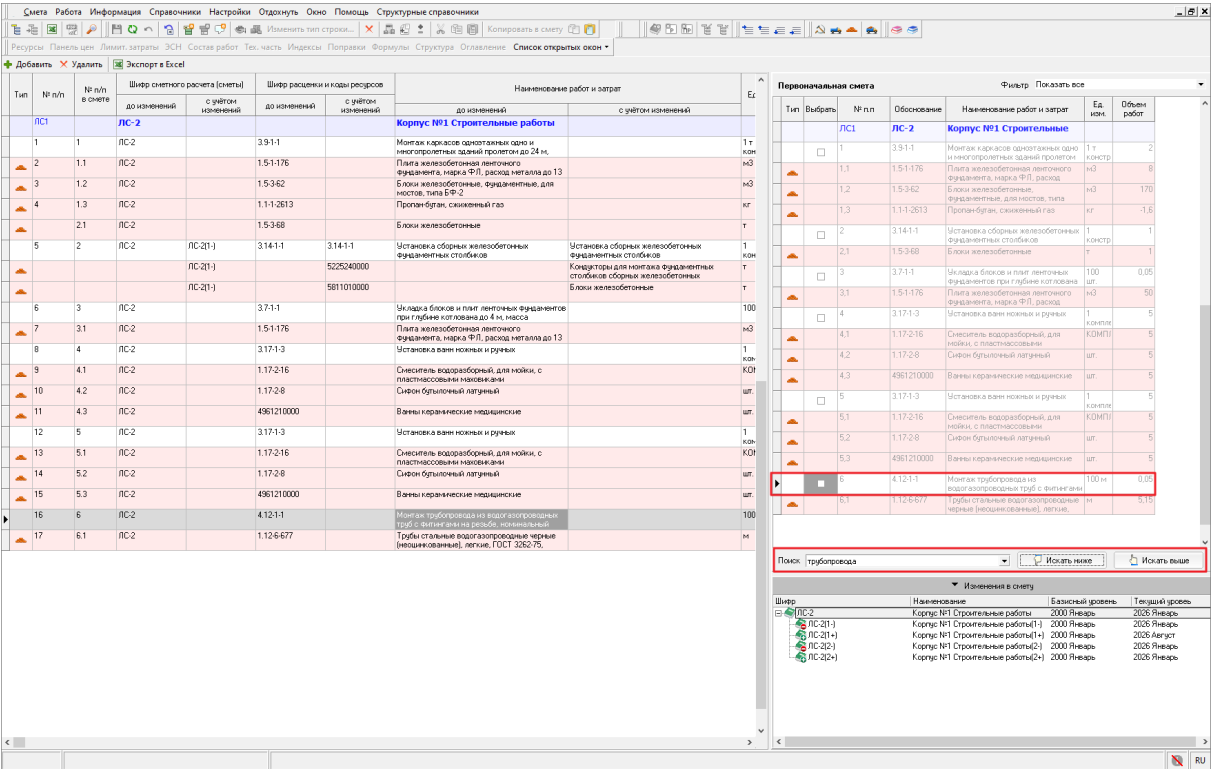

Обратите внимание, поиск осуществляется с учетом установленного фильтра.

Для удаления связи выделите строку и снимите флажок в колонке "Выбрать".

Связи подчиненных строк

При формировании связей строк сметы и сопоставительной ведомости объемов работ производится автоматическая привязка подчиненных строк по обоснованию.

Если обоснование подчиненных строк найдено и в исходной смете и смете на изменение, то сопоставление подчиненных строк производится так же, как для основных строк.

В том случае, если подчиненная строка присутствует только в исходной смете, то в СВОР будут переданы только исходные данные, такая строка подсвечивается красным цветом с подсказкой при наведении: "Отсутствуют данные для сравнения"

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отчетность

Оформление

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы: Панель цен, Лимит, затраты, ЭСН, Состав работ, Тех. часть, Индексы, Поправки, Формулы, Структура, Отслеживание, Список открытых окон

Добавить

Удалить

Экспорт в Excel

Тип	№ п/п в смете	№ п/п в смете	Шифр сметного расчета (сметы)		Шифр расценок и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на принятый объем работ и затрат		
			до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений		до изменений	с учетом изменений	с учетом изменений
	2	1.1	ЛС-2		391730000		Диски с алмазными напильниками	шт.	0.003			0
	3	1.2	ЛС-2		5714310000		Плиты облицовочные гранитные	м2	1			
	4	2	ЛС-2		3.91-4		Монтаж каркасов одноэтажных зданий и неогороженных заборов высотой до 30 м, с несущими и подвесными конструкциями	1 т	5			
	5	2.1	ЛС-2		5261520000		Стальные конструкции каркаса	т	5			
	6	3	ЛС-2	ЛС-2(1+)	3.91-1	3.91-1	Монтаж каркасов одноэтажных зданий и неогороженных заборов высотой до 15 м без краев	1 т	22			
	7	3.1	ЛС-2		1.5-1-176		Плиты железобетонные, фасадные, марки ФП, расклад, нетяжелые до 13 кг	м3	0			
	8	3.2	ЛС-2		1.5-3-62		Блоки железобетонные, фасадные, для монтажа БФ-2	м3	0			
	9	3.3	ЛС-2		1.1-1-2613		Пропан-бутан, сжиженный газ	кг	0			
	10		ЛС-2(1+)		5261520000		Стальные конструкции каркаса	т	22			

Смета на добавление

Фильтр: Показать все

Тип	Выбор	№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ
	☐	1	ЛС-1	ЛС-2(1+)	Корпус №1 Строительные	100 м2
	☐	1.1	3.15-1-1	Облицовка стен гранитными плитами полированной толщиной 40 мм при	шт.	0.015
	☐	1.2	1.7-3-1	Диск отрезной сегментированный с алмазным покрытием для резки	шт.	6
	☐	2	1.31-1-226	Плита гранитная облицовочная, лицевая, цветная, толщина от 70 до	м2	22
	☒	2.1	3.91-1	Монтаж каркасов одноэтажных зданий и неогороженных заборов	1 т	22
	☐	3	5261520000	Стальные конструкции каркаса	т	0.02
	☐	3.1	3.4-1-1	Колоновое бурение скважин глубиной до 30 м с применением	100 М бурен	0.008
	☐	3.2	1.12-7-183	Трубы буровые геологические из стали группы	м	0.0016
	☐	3.3	1.1-1-183	Делител бурового трещинообразования III 215.3 MC3 FB	шт.	0.0034

Поиск: Обоснование или наименование работ и затрат

Искать ниже

Искать выше

Изменения в смету

Шифр	Наименование	Базисный уровень	Текущий уровень
ЛС-2	Корпус №1 Строительные работы	2000 Январь	2026 Январь
ЛС-2(1+)	Корпус №1 Строительные работы(1+)	2000 Январь	2026 Январь
ЛС-2(1+)(1)	Корпус №1 Строительные работы(1+)(1)	2000 Январь	2026 Август
ЛС-2(1+)(1+)	Корпус №1 Строительные работы(1+)(1+)	2000 Январь	2026 Август
ЛС-2(2)	Корпус №1 Строительные работы(2)	2000 Январь	2026 Январь
ЛС-2(2+)	Корпус №1 Строительные работы(2+)	2000 Январь	2026 Январь

В случае появления в смете на изменения новой подчиненной строки, которой не было в первоначальной смете, будет добавлена строка без данных "до изменений", а показатели "с учетом изменений" будут заполнены.

Добавление новых строк в ведомость

В сопоставительную ведомость можно добавлять только новые позиции из смет на добавление (+).

Для добавления новых строк в сопоставительную ведомость на панели инструментов ведомости нажмите "Добавить" - "Главную строку", либо нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Добавить главную строку"

Добавление разделов

Добавление разделов в сопоставительную ведомость предусмотрено из смет на добавление (+).

Для этого в правой части в секции "Изменения в смету" выберите смету на добавление, нажмите на строку с наименованием нужного раздела и удерживая, перетащите в рабочую область сопоставительной ведомости (левая часть)

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отдохнуть Окно Помощь Структурные справочники

Ресурсы Панель цен Лимит затрат ЭСН Состав работ Тех. часть Индекс Поправка Формулы Структура Отглавление Список открытых окон

Добавить Удалить Экспорт в Excel

Тип	№ п/п в смете	Шир сметного расчета (сметы)		Шир расценок и коды ресурсов		Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на принятой изначальной работ и затрат		Сметная	
		до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений			до изменений	увеличение	до изменений	увеличение
▲	8	3.1	ЛС-2		1.51-176	Плита железобетонная легкого фундамента, марка ФЛ, расклад металл до 13 кг	м3	50		50	53.177
▲	9	4	ЛС-2		3.17-1.3	Установка ванн кованых и ручьев	1 комплект	5		5	835.42
▲	10	4.1	ЛС-2		1.17-2.16	Смеситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми наконечниками	КОМПЛЕК	5		5	468
▲	11	4.2	ЛС-2		1.17-2.8	Сифон бутылочный латунный	шт.	5		5	460.55
▲	12	4.3	ЛС-2		4961210000	Ванны керамические напольные	шт.	5		5	0
▲	13	5	ЛС-2		3.17-1.3	Установка ванн кованых и ручьев	1 комплект	5		5	835.42
▲	14	5.1	ЛС-2		1.17-2.16	Смеситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми наконечниками	КОМПЛЕК	5		5	468
▲	15	5.2	ЛС-2		1.17-2.8	Сифон бутылочный латунный	шт.	5		5	460.55
▲	16	5.3	ЛС-2		4961210000	Ванны керамические напольные	шт.	5		5	0
▲	17	6	ЛС-2		4.12-1.1	Монтаж трубопровода на водопроводные трубы с фитингами на резьбе, номинальный диаметр труб	100 м	0.05		0.05	156.72
▲	18	6.1	ЛС-2		1.12-6-677	Трубы стальные водопроводные черные (нестроительные), легкие, ГОСТ 3262-75, диаметр	м	5.15		5.15	15.71
▲	19		ЛС-2(2+)		3.14-1.1	Установка обрешет железобетонных фундаментных столбиков	1 конструкция	3		3	189.2
▲	20		ЛС-2(2+)		3.7-1.1	Укладка блоков и плит легкого фундамента при глубине котлована до 4 м, масса конструкций	100 шт.	0.05		0.05	124.9
▲	21		ЛС-2(2+)		1.51-176	Плита железобетонная легкого фундамента, марка ФЛ, расклад металл до 13 кг	м3	50		50	53.17

Смета на добавление

Фильтр Показать все

Тип	Выбор	№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	О
▲		1	3.14-1.1	Установка обрешет железобетонных фундаментных столбиков	1 конструкция	1
▲		2	3.7-1.1	Укладка блоков и плит легкого фундамента при глубине котлована	100 шт.	2
▲		2.1	1.51-176	Плита железобетонная легкого фундамента, марка ФЛ, расклад	м3	2

Поиск: Обоснование или наименование Искать ниже Искать выше

Изменения в смете

Шир	Наименование	Единица измерения	Количество
ЛС-2	Корпус НП Строительные работы	Базисный элемент	1
ЛС-2(1)	Корпус НП Строительные работы(1)	2000 Январь	2
ЛС-2(1+)	Корпус НП Строительные работы(1+)	2000 Январь	2
ЛС-2(2)	Корпус НП Строительные работы(2)	2000 Январь	2
ЛС-2(2+)	Корпус НП Строительные работы(2+)	2000 Январь	2

Строки раздела, которые не имеют связи со строками ведомости, будут автоматически перенесены в документ вместе с разделом.

Обоснование изменений и ссылки на техническую документацию


Для подтверждения внесенных изменений каждая строка сопоставительной ведомости сопровождается технической документацией и обоснованием изменений

The screenshot shows the 'Смета' (Budget) software interface. The main table displays budget items with columns for 'Обоснование изменений' (Justification of changes) and 'Ссылка на техническую документацию' (Link to technical documentation). The table is divided into sections for 'до изменений' (before changes) and 'с учетом изменений' (with changes). The 'Обоснование изменений' column contains text like 'Доп. соглашение 04/19 от 01.08.2026 г.' and 'Чертежи № КЛ-1241'. The 'Ссылка на техническую документацию' column contains 'Чертежи № КЛ-1241' and 'Чертежи № КЛ-1249'. The sidebar on the right shows a list of drawings under the heading 'Изменения в смете' (Changes in budget), including 'Корпус №1 Строительные работы' and 'Корпус №1 Строительные работы(1-4)'.


При формировании связи строки ведомости со строкой сметы колонка "Ссылка на техническую документацию" заполняется автоматически из поля "Список чертежей" в параметрах исходной сметы для колонки "до изменений" или из сметы на изменение для колонки "с учетом изменений"

The screenshot shows the 'Смета' (Budget) software interface with the 'Параметры объекта' (Object parameters) dialog box open. The dialog box contains various fields for object parameters, including 'Типовой настройки: ТОН-2001 (ИГЗ) Дом 80 - Новое строительство'. The 'Ссылка на техническую документацию' field is highlighted in red, showing 'Чертежи № КЛ-1241'. The 'Обоснование изменений' field is also highlighted in red, showing 'Доп. соглашение 04/19 от 01.08.2026 г.'.

Колонка "Обоснование изменений" при формировании связи заполняется автоматически из поля "Основание" на вкладке "СВОР" в параметрах

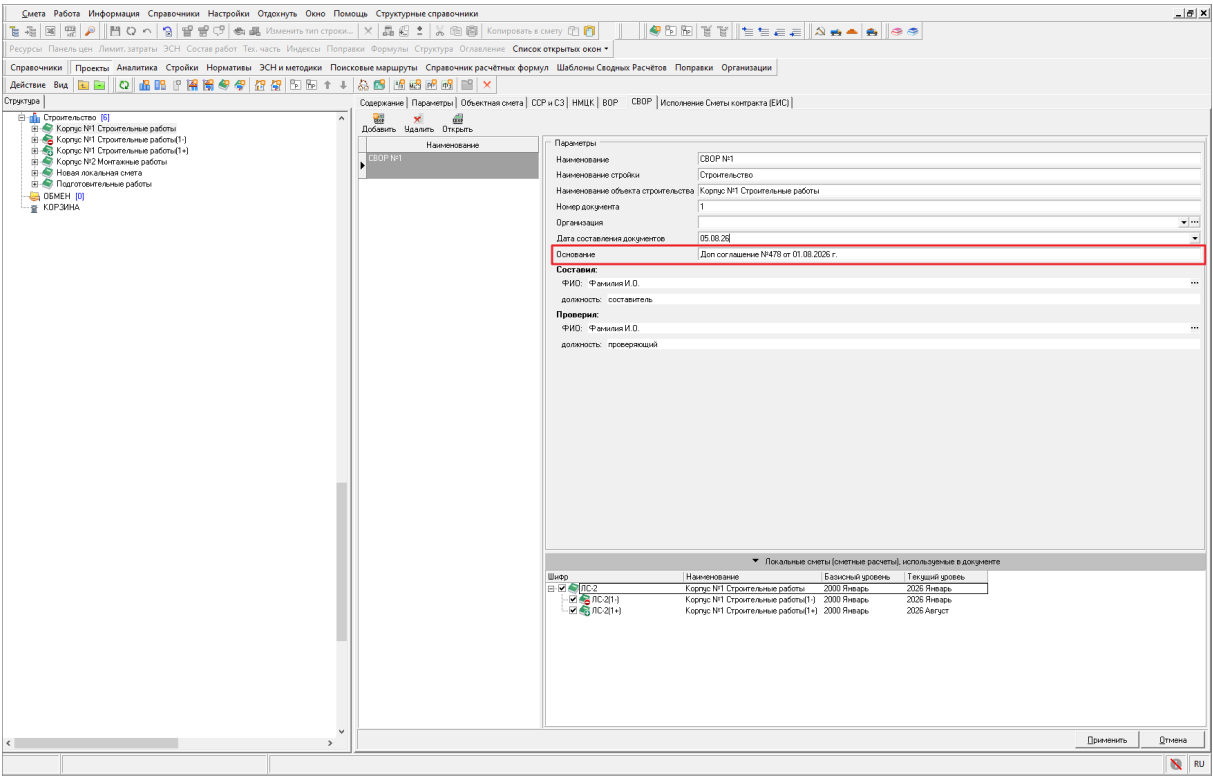

Эту информацию можно изменить вручную. Для этого нажмите два раза левой кнопкой мыши на ячейку и внесите изменения

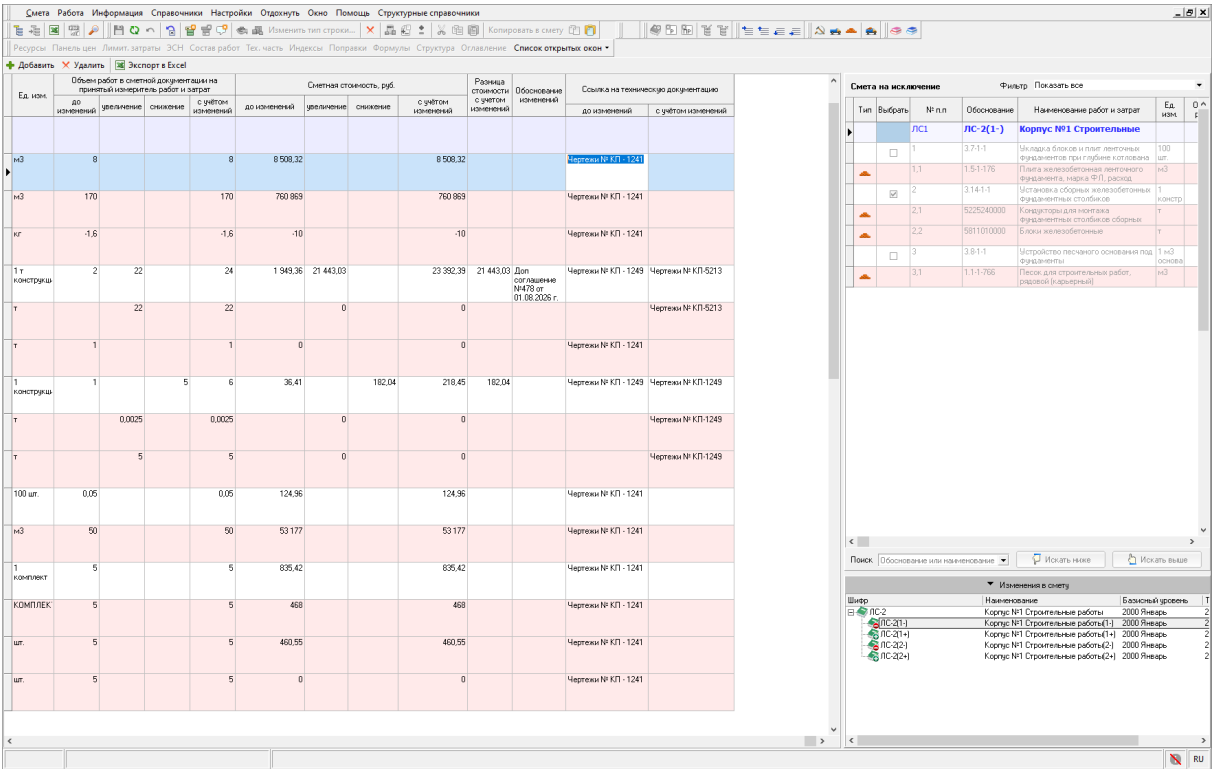

Также доступно групповое изменение ссылок для выделенных строк. Выделите строки, в нужной ячейке нажмите два раза левой кнопкой мыши и внесите изменения

Смета													
Смета: Работа: Информация: Справочники: Настройки: Отдохнуть: Окно: Помощь: Структурные справочники													
Ресурсы: Панель цен: Лимит: затраты: ЭСН: Состав работ: Тех. часть: Индексы: Поправки: Формулы: Структура: Отслеживание: Список открытых окон													
Добавить Удалить Экспорт в Excel													
Ед. изм.	до изменений	Объем работ в сметной документации на принятый измеритель работ и затрат			Сметная стоимость, руб.			Разница стоимости с учетом изменений	Обоснование изменений	Ссылка на техническую документацию			
		до изменений	увеличение	сокращение	до изменений	увеличение	сокращение			до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений
м3	8			8	8 508.32		8 508.32			Чертежи № КП - 1241			
м3	170			170	760 869		760 869			Чертежи № КП - 1241			
кг	-1.6			-1.6	-10		-10			Чертежи № КП - 1241			
1 т конструкций	2	22		24	1 949.36	21 443.03	23 392.39	21 443.03	Доп. соглашение №429 от 01.08.2026 г.	Чертежи № КП - 1249	Чертежи № КП-5213		
т		22		22	0		0				Чертежи № КП-5213		
т	1			1	0		0			Чертежи № КП - 1241			
1 конструкция	1		5	6	36.41		182.04	218.45	182.04	Чертежи № КП - 1249	Чертежи № КП-1249		
т		0.0025		0.0025	0		0				Чертежи № КП-1249		
т		5		5	0		0				Чертежи № КП-1249		
100 шт.	0.05			0.05	124.96		124.96			Чертежи № КП - 1241			
м3	50			50	53 177		53 177			Чертежи № КП - 1241			
1 комплект	5			5	835.42		835.42			Чертежи № КП - 1241			
КОМПЛЕК	5			5	468		468			Чертежи № КП - 1241			
шт.	5			5	460.55		460.55			Чертежи № КП - 1241			
шт.	5			5	0		0			Чертежи № КП - 1241			

Смета на исключение

Фильтр: Показать все

Тип	Выбор	№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	0	1
	☐	1	3.7.1-1	Укладка блоков и плит железобетонных фундаментов при глубине котлована	100 шт.		180
	☒	1.1	1.5.1-176	Плита железобетонная ленточного фундамента, ширина 900, высота	м3		
	☒	2	3.14-1-1	Установка сборных железобетонных фундаментных столбиков	1 констр.		
	☒	2.1	522540000	Кондукторы для монтажа фундаментных столбиков сборных	т		
	☒	2.2	5811010000	Блоки железобетонные	т		
	☐	3	3.8-1-1	Устройство песчаного основания под фундаментом	1 м3 осн.		
	☒	3.1	1.1-1-765	Песок для строительных работ, районный (партерный)	м3		

Поиск:

Изменения в смету

Шифр	Наименование	Базисный уровень	1
ЛС-2	Корпус №1 Строительные работы	2000 Январь	2
ЛС-2(1)	Корпус №1 Строительные работы(1)	2000 Январь	2
ЛС-2(1+)	Корпус №1 Строительные работы(1+)	2000 Январь	2
ЛС-2(2)	Корпус №1 Строительные работы(2)	2000 Январь	2
ЛС-2(2+)	Корпус №1 Строительные работы(2+)	2000 Январь	2

Если изменить информацию в колонке "Обоснование изменений" в одной строке сопоставительной ведомости, то она обновится во всех ведомостях, которые содержат ту же связь сметных строк.

Если изменить информацию в колонке "Ссылка на тех. документацию" в одной строке сопоставительной ведомости, то она обновится в тех строках ведомости, которые содержат данный о той же сметной строке.

Удаление строк

Удалять можно только строки, добавленные вручную в сопоставительную ведомость.

Для удаления строки выделите ее и на панели инструментов нажмите "Удалить", либо нажмите правой кнопкой мыши и выберите аналогичный пункт в контекстном меню

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отладить

Окно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы | Панель цен | Лимит затрат | ЭСН | Состав работ | Тек. часть | Индексы | Поправки | Формулы | Структура | Отслеживание | Список открытых окон

Добавить

Удалить

Экспорт в Excel

Тип	№ п/п	№ п/п в смете	Шир сметного расчета (сметы)		Шир расцены и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на данный интервал работ и затрат			Сметная	
			до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений		до изменений	увеличение	до изменений	увеличение	
	2.1	ЛС-2			1.5-3.68		Блоки железобетонные	с учетом изменений	т	до изменений	увеличение	с учетом изменений	до изменений	увеличение
	2	ЛС-2	ЛС-2(1-)	3141-1	3141-1		Установка сборных железобетонных фундаментных стоек. При необходимости	Установка сборных железобетонных фундаментных стоек	1	конструкция	1	5	6	36.41
			ЛС-2(1-)		5225240000		Кондукторы для монтажа фундаментных стоек	Кондукторы для монтажа сборных железобетонных стоек	т		0.0025	0.0025		
			ЛС-2(1-)		5811010000		Блоки железобетонные	Блоки железобетонные	т		5	5		
	3	ЛС-2		3.71-1			Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0.5 т	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0.5 т	100	шт.	0.05	0.05	124.96	
	4	ЛС-2		1.5-1.76			Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФПД, расход металла до 13 кг	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФПД, расход металла до 13 кг	м3	50	50	50	53.177	
	5	ЛС-2		3.171-3			Установка вент. колонн и рунки	Установка вент. колонн и рунки	1	шт.	5	5	835.42	
	6	ЛС-2		1.17-2.16			Сноситель вод. для мойки, с пластмассовыми насадками. Сирок. брызгоулов.	Сноситель вод. для мойки, с пластмассовыми насадками. Сирок. брызгоулов.	Ins	пек.	5	5	468	
	7	ЛС-2		1.17-2.8			Сирок. брызгоулов. латунный	Сирок. брызгоулов. латунный	шт.	5	5	5	460.95	
	8	ЛС-2		4.961210000			Ванна керамическая наливная	Ванна керамическая наливная	шт.	5	5	5	0	
	9	ЛС-2		3.171-3			Установка вент. колонн и рунки	Установка вент. колонн и рунки	1	комплект	5	5	835.42	
	10	ЛС-2		1.17-2.16			Сноситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми насадками. Сирок. брызгоулов. латунный	Сноситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми насадками. Сирок. брызгоулов. латунный	КОМПЛЕК.	5	5	5	468	
	11	ЛС-2		1.17-2.8			Сирок. брызгоулов. латунный	Сирок. брызгоулов. латунный	шт.	5	5	5	460.95	
	12	ЛС-2		4.961210000			Ванна керамическая наливная	Ванна керамическая наливная	шт.	5	5	5	0	
	13	ЛС-2		4.121-1			Монтаж трубопровода из водопроводящих труб с фитингами на резьбе, номинальный диаметр труб	Монтаж трубопровода из водопроводящих труб с фитингами на резьбе, номинальный диаметр труб	100	м	0.05	0.05	156.72	
	14	ЛС-2		1.126-677			Трубы стальные водопроводящие черные (неокрашенные), легкие, ГОСТ 3062-75, диаметр	Трубы стальные водопроводящие черные (неокрашенные), легкие, ГОСТ 3062-75, диаметр	м	5.15	5.15	5.15	15.71	

Смета на исключение

Фильтр

Показать все

Тип	Выбор	ЛС	№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	0	1
	☐	ЛС-2	1	3.71-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0.5 т	100 шт.		
	☐	ЛС-2	1.1	1.5-1.76	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФПД, расход	м3		
	☐	ЛС-2	2	3.141-1	Установка сборных железобетонных фундаментных стоек	1 конструкция		
	☐	ЛС-2	2.1	5225240000	Кондукторы для монтажа фундаментных стоек	т		
	☐	ЛС-2	2.2	5811010000	Блоки железобетонные	т		
	☐	ЛС-2	3	3.81-1	Устройство песчаного основания под фундамента	1 м3 основа		
	☐	ЛС-2	3.1	1.1-1.766	Песок для строительных работ, разовой (карьерный)	м3		

Измения в смете

Шифр	ЛС-2	Наименование	Базисный уровень	1
	ЛС-2	Корпус НР Строительные работы	2000 Январь	2
	ЛС-2(1-)	Корпус НР Строительные работы(1-)	2000 Январь	2
	ЛС-2(1+)	Корпус НР Строительные работы(1+)	2000 Январь	2
	ЛС-2(2-)	Корпус НР Строительные работы(2-)	2000 Январь	2
	ЛС-2(2+)	Корпус НР Строительные работы(2+)	2000 Январь	2

Выделение строк

В документе сопоставительной ведомости реализован функционал выделения строк. Для того чтобы открыть панель выделения строк, нажмите правой кнопкой мыши и выберите "Выделение строк"

Смета

Работа

Информация

Справочники

Настройки

Отладить

Окно

Помощь

Структурные справочники

Ресурсы | Панель цен | Лимит затрат | ЭСН | Состав работ | Тек. часть | Индексы | Поправки | Формулы | Структура | Отслеживание | Список открытых окон

Добавить

Удалить

Экспорт в Excel

Тип	№ п/п	№ п/п в смете	Шир сметного расчета (сметы)		Шир расцены и коды ресурсов		Наименование работ и затрат		Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на данный интервал работ и затрат			Сметная	
			до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений	до изменений	с учетом изменений		до изменений	увеличение	до изменений	увеличение	
	2.1	ЛС-2			1.5-3.68		Блоки железобетонные	с учетом изменений	т	до изменений	увеличение	с учетом изменений	до изменений	увеличение
	2	ЛС-2	ЛС-2(1-)	3141-1	3141-1		Установка сборных железобетонных фундаментных стоек. При необходимости	Установка сборных железобетонных фундаментных стоек	1	конструкция	1	5	6	36.41
			ЛС-2(1-)		5225240000		Кондукторы для монтажа фундаментных стоек	Кондукторы для монтажа сборных железобетонных стоек	т		0.0025	0.0025		
			ЛС-2(1-)		5811010000		Блоки железобетонные	Блоки железобетонные	т		5	5		
	3	ЛС-2		3.71-1			Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0.5 т	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0.5 т	100	шт.	0.05	0.05	124.96	
	4	ЛС-2		1.5-1.76			Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФПД, расход металла до 13 кг	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФПД, расход металла до 13 кг	м3	50	50	50	53.177	
	5	ЛС-2		3.171-3			Установка вент. колонн и рунки	Установка вент. колонн и рунки	1	шт.	5	5	835.42	
	6	ЛС-2		1.17-2.16			Сноситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми насадками. Сирок. брызгоулов.	Сноситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми насадками. Сирок. брызгоулов.	Ins	пек.	5	5	468	
	7	ЛС-2		1.17-2.8			Сирок. брызгоулов. латунный	Сирок. брызгоулов. латунный	шт.	5	5	5	460.95	
	8	ЛС-2		4.961210000			Ванна керамическая наливная	Ванна керамическая наливная	шт.	5	5	5	0	
	9	ЛС-2		3.171-3			Установка вент. колонн и рунки	Установка вент. колонн и рунки	1	комплект	5	5	835.42	
	10	ЛС-2		1.17-2.16			Сноситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми насадками. Сирок. брызгоулов. латунный	Сноситель водоразборный, для мойки, с пластмассовыми насадками. Сирок. брызгоулов. латунный	КОМПЛЕК.	5	5	5	468	
	11	ЛС-2		1.17-2.8			Сирок. брызгоулов. латунный	Сирок. брызгоулов. латунный	шт.	5	5	5	460.95	
	12	ЛС-2		4.961210000			Ванна керамическая наливная	Ванна керамическая наливная	шт.	5	5	5	0	
	13	ЛС-2		4.121-1			Монтаж трубопровода из водопроводящих труб с фитингами на резьбе, номинальный диаметр труб	Монтаж трубопровода из водопроводящих труб с фитингами на резьбе, номинальный диаметр труб	100	м	0.05	0.05	156.72	
	14	ЛС-2		1.126-677			Трубы стальные водопроводящие черные (неокрашенные), легкие, ГОСТ 3062-75, диаметр	Трубы стальные водопроводящие черные (неокрашенные), легкие, ГОСТ 3062-75, диаметр	м	5.15	5.15	5.15	15.71	

Смета на исключение

Фильтр

Показать все


Тип	Выбор	ЛС	№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	0	1
	☐	ЛС-2	1	3.71-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0.5 т	100 шт.		
	☐	ЛС-2	1.1	1.5-1.76	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФПД, расход	м3		
	☐	ЛС-2	2	3.141-1	Установка сборных железобетонных фундаментных стоек	1 конструкция		
	☐	ЛС-2	2.1	5225240000	Кондукторы для монтажа фундаментных стоек	т		
	☐	ЛС-2	2.2	5811010000	Блоки железобетонные	т		
	☐	ЛС-2	3	3.81-1	Устройство песчаного основания под фундамента	1 м3 основа		
	☐	ЛС-2	3.1	1.1-1.766	Песок для строительных работ, разовой (карьерный)	м3		

Измения в смете

Шифр	ЛС-2	Наименование	Базисный уровень	1
	ЛС-2	Корпус НР Строительные работы	2000 Январь	2
	ЛС-2(1-)	Корпус НР Строительные работы(1-)	2000 Январь	2
	ЛС-2(1+)	Корпус НР Строительные работы(1+)	2000 Январь	2
	ЛС-2(2-)	Корпус НР Строительные работы(2-)	2000 Январь	2
	ЛС-2(2+)	Корпус НР Строительные работы(2+)	2000 Январь	2

Выделение строк производится аналогично функционалу выделения строк в локальной смете.

Доступно выделение строк по критерию "Показать строки без изменений", для этого нажмите соответствующий пункт на панели выделения

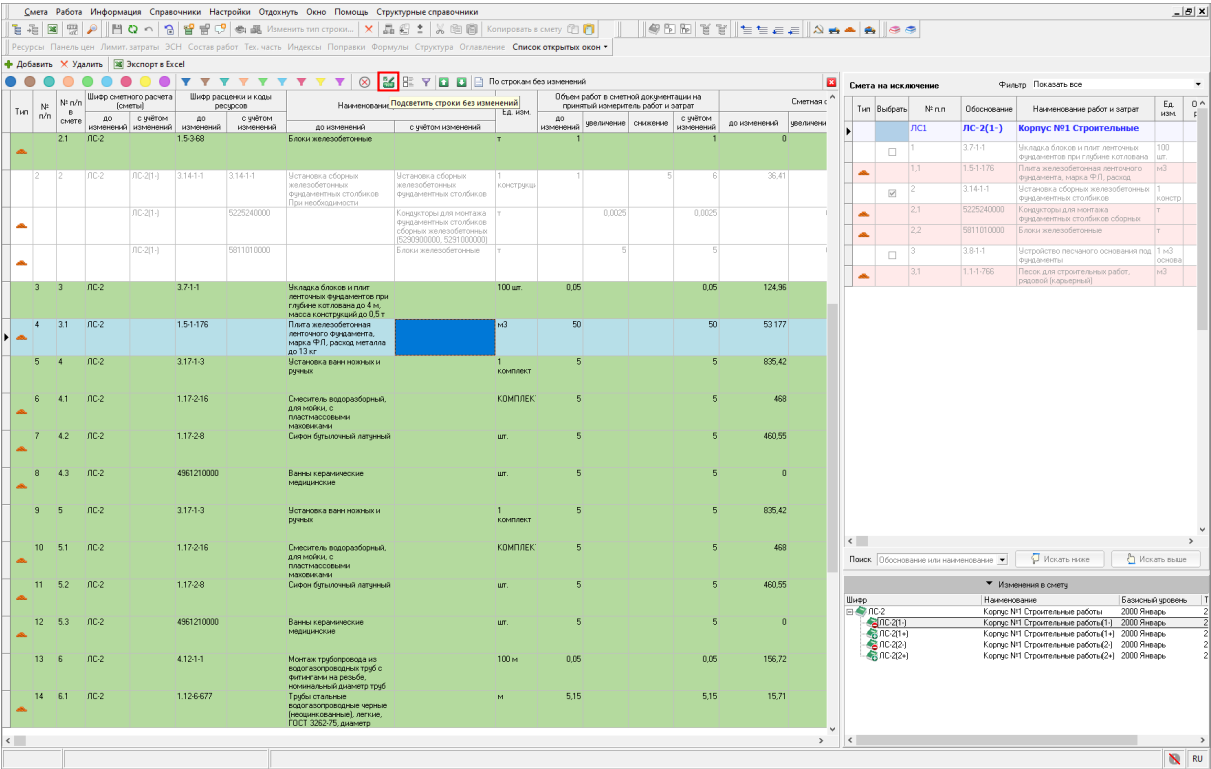

Строки, не имеющие изменений, будут выделены зеленым цветом. Для снятия выделения нажмите повторно "Показать строки без изменений".

Синхронизация сопоставительной ведомости со сметой

Если в исходной смете была изменена или удалена позиция, созданная сопоставительная ведомость обновляется с учетом этих изменений.

Экспорт сопоставительной ведомости в Excel

Сформированную ведомость объемов работ можно выгрузить в Excel, для этого нажмите на панели инструментов ведомости "Экспорт в Excel" или нажмите правой кнопкой мыши и выберите аналогичный пункт

Смета Работа Информация Справочники Настройки Отладка Осво Помощь Структурные справочники

Ресурсы Панель цен Листы затрат ТСН Состав работ Тек. часть Индекс Поправки Формулы Структура Отладка Список открытых окон

Добавить Удалить **Экспорт в Excel**

Тип	№ п/п в смете	Шир. сметного расчета (сметы)	Шир. расценок и кат. ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации на принятый интервал работ и затрат	Сметная стоимость
		до изменений	до изменений	до изменений		до изменений	до изменений
1	2.1	ПС-2	1.53.48	Блоки железобетонные	т	1	0
2	2	ПС-2	314-1.1	Установка сборных железобетонных фундаментных столбов	1 конструкция	1	36.41
3	3	ПС-2	3.7-1.1	Укладка блоков и плит железобетонных фундаментов при глубине котлована до 0.5 т	100 шт.	0.05	124.96
4	3.1	ПС-2	1.5-1.76	Плита железобетонная ленточного фундамента, марка ФЛ, раскладка сетки до 13 кг	м3	50	53.177
5	4	ПС-2	3.17-1.3	Установка ванн новых и старых	1 комплект	5	85.42
6	4.1	ПС-2	1.17-2.16	Смеситель водоразборный, для мойки с пластмассовыми насадками	КОМПЛЕК	5	468
7	4.2	ПС-2	1.17-2.8	Сифон бытовой, латунный	шт	5	480.55

Смета на исключение

Тип	Выбор	№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	0
1	☐	1	3.7-1.1	Укладка блоков и плит железобетонных фундаментов при глубине котлована до 0.5 т	100 шт.	1
2	☒	2	314-1.1	Установка сборных железобетонных фундаментных столбов	1 конструкция	1
3	☐	3	3.8-1.1	Устройство песчаного основания под фундаментом	1 м3	1

Поиск: [Обоснование или наименование] [Искать ниже] [Искать выше]

Изменения в смету

Шир.	Наименование	Базисный уровень	Т
ПС-2	Корпус №1 Строительные работы	2000 Январь	2
ПС-2.1	Корпус №1 Строительные работы(1-1)	2000 Январь	2
ПС-2.1.1	Корпус №1 Строительные работы(1-1-1)	2000 Январь	2
ПС-2.1.1.1	Корпус №1 Строительные работы(1-1-1-1)	2000 Январь	2

Выберите форму документа и нажмите "Сформировать"

Доступные документы

Сопоставительные ведомости изменений объемов работ и сметной стоимости [0 из 1]

☐ Сопоставительная ведомость для ТСН-2001

ООО "Фирма СтройСофт"

Сформировать

Отмена

Обновить

Настроить >>

В том случае если необходимо вывести на печать все строки ведомости, а не только строки с изменениями, то снимите флажок "Печатать строки без изменений"

Сопоставительная ведомость для ТСН-2001

☒ Печатать строки без изменений

Сформировать

Отмена

Статус:

Отчетная форма будет сформирована

1	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		

Рекомендуемый образец формы "Сопоставительная ведомость изменений видов, объемов работ и сметной стоимости" представлен в Приложении N 4 к Общим указаниям по применению ТСН-2001, Глава 12.

Экспорт сопоставительной ведомости во внутреннем формате

Сопоставительные ведомости, созданные на основании смет на изменение, экспортируются только совместно с этими сметами.

Для экспорта комплекта, включающего первоначальную смету, связанные с ней сметы на изменение, а также сформированные на их основе сопоставительные ведомости, нажмите правой кнопкой мыши на исходную смету, выберите пункт "Экспорт" - "Экспорт объектов (*.sobx)"

